

Kick Off

Nuevo Modelo Atención E2E

Dependencias e Impedimentos

Especialidades/AACC en JIRA

Proceso de Desarrollo de Software

Systems Engineering | Abril 2024



Agenda

- 1 Objetivo
- 2 Participantes considerados para Piloto
- 3 Nuevo Modelo de Atención E2E de Dependencias e Impedimentos
- 4 Roadmap
- 5 Next Steps..



1. Objetivo del KickOff

Comunicar el funcionamiento del **Piloto del Nuevo Modelo de Atención de Dependencias e Impedimentos** con los involucrados para la definición de responsables y próximos pasos

2. Participantes considerados para Piloto de Modelo de dependencias e impedimentos

Especialidades / Áreas de Apoyo piloto


Engineering			Finanzas	Client Solutions	Jurídico
Infrastructure & IT Operations	Architecture Engineering	Security Architecture	Contabilidad Corporativa	UX	Legal Services
Fabián de Jesús Martínez Navarro	Manuel Trejo González	Carmina Cecilia Espinosa	Elizabeth Joselin Rios	Nora Tejeda	Mario Alberto Gloria
					Procurement
					TBD

Shapers

Systems Engineering	SP&C	Release Execution Managers (REMs)	RTEs	SDA Office
Rosa Isela Briones Luz Cuevas Mariana Rabadan	Olimpia Martinez Rafael Meza Jose Alfredo Jimenez Karina Lopez Herrera	Adan Romero Sanchez Carlos Alberto Ruiz Aguilar Emilio Jose Bravo Rodriguez Lilia Torres Lopez Manuel Francisco Fernández Mera	Diana Ramirez Gonzalez Erika Yvette Flores Padilla Fernando Reyes Trejo Luz Estrella Toledo Domínguez Marco Polo Hernández Castellanos Paola Navarro Penagos Pavel Perea Romero	Analucía Cuellar Andrés Neria
BPE	Service Owners			Agile Office
Laura Santisteban Ricardo Almonte Hugo Ramos	App Owners (Tech Leads)			Francia Leticia Fuentes

3. Nuevo Modelo de Atención E2E de Dependencias e Impedimento

Implementar el nuevo modelo homologado para la atención de impedimentos relacionados a las áreas de apoyo y scrums que participan en el Proceso de Creación

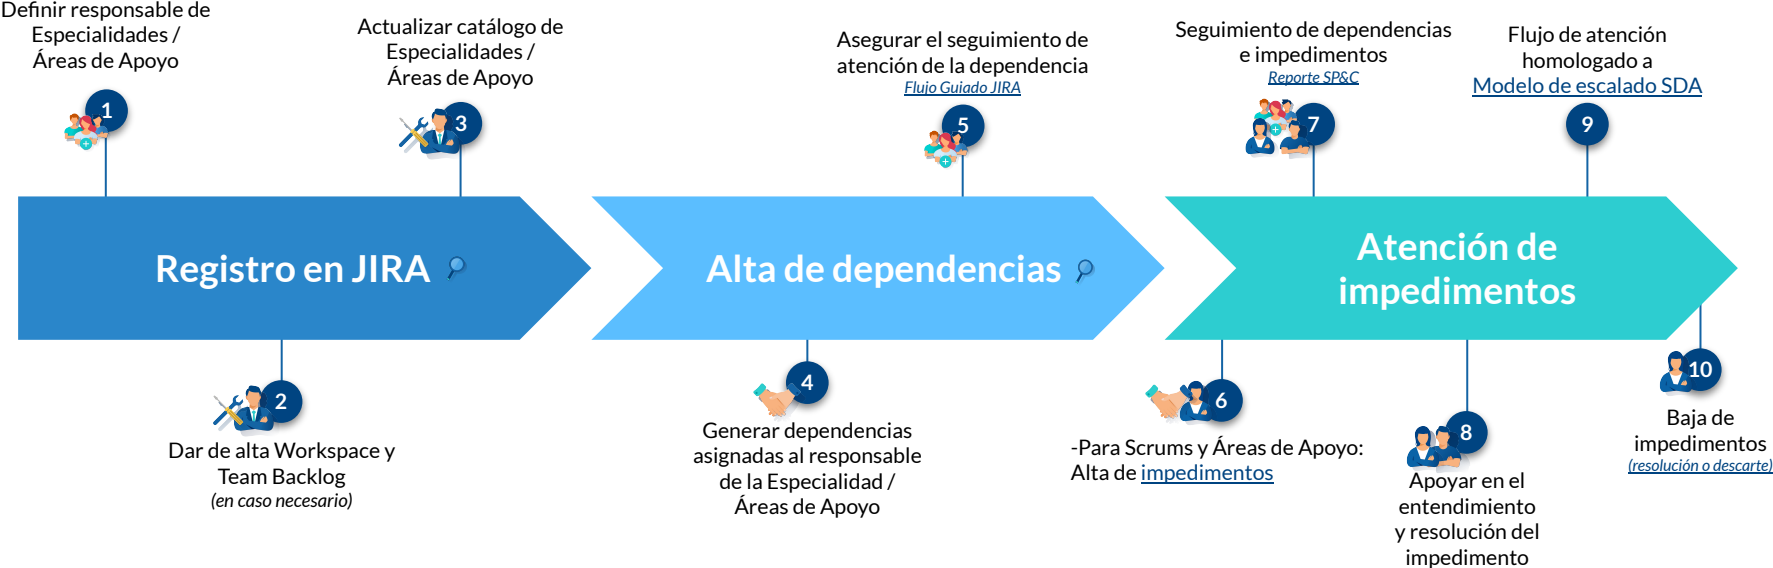

¡Recuerda!



Una dependencia es una solicitud o entregable proporcionado por un especialista de cualquier otro equipo o Área de Apoyo



Son tareas independientes, negociables, planificables y cuantificables



¿Qué es un impedimento?

Cualquier asunto que impida llevar a cabo un compromiso (Feature, Historia de usuario o Dependencia)



Indisponibilidad de herramientas



Imposibilidad de conseguir casos de pruebas



Asuntos con Áreas de Apoyo que no atienden por medio de dependencias



Stoppers que se presenten con entidades externas como CNBV o INFONAVIT



Incumplimiento en una fecha de entrega

No aplican...



Riesgos o warnings (algo que pueda suceder)



Solicitudes dentro del nivel de servicio acordado



Dependencias levantadas de forma extemporánea




Asuntos que se puedan resolver en el equipo de forma interna



Staffeo de recursos

4. Roadmap

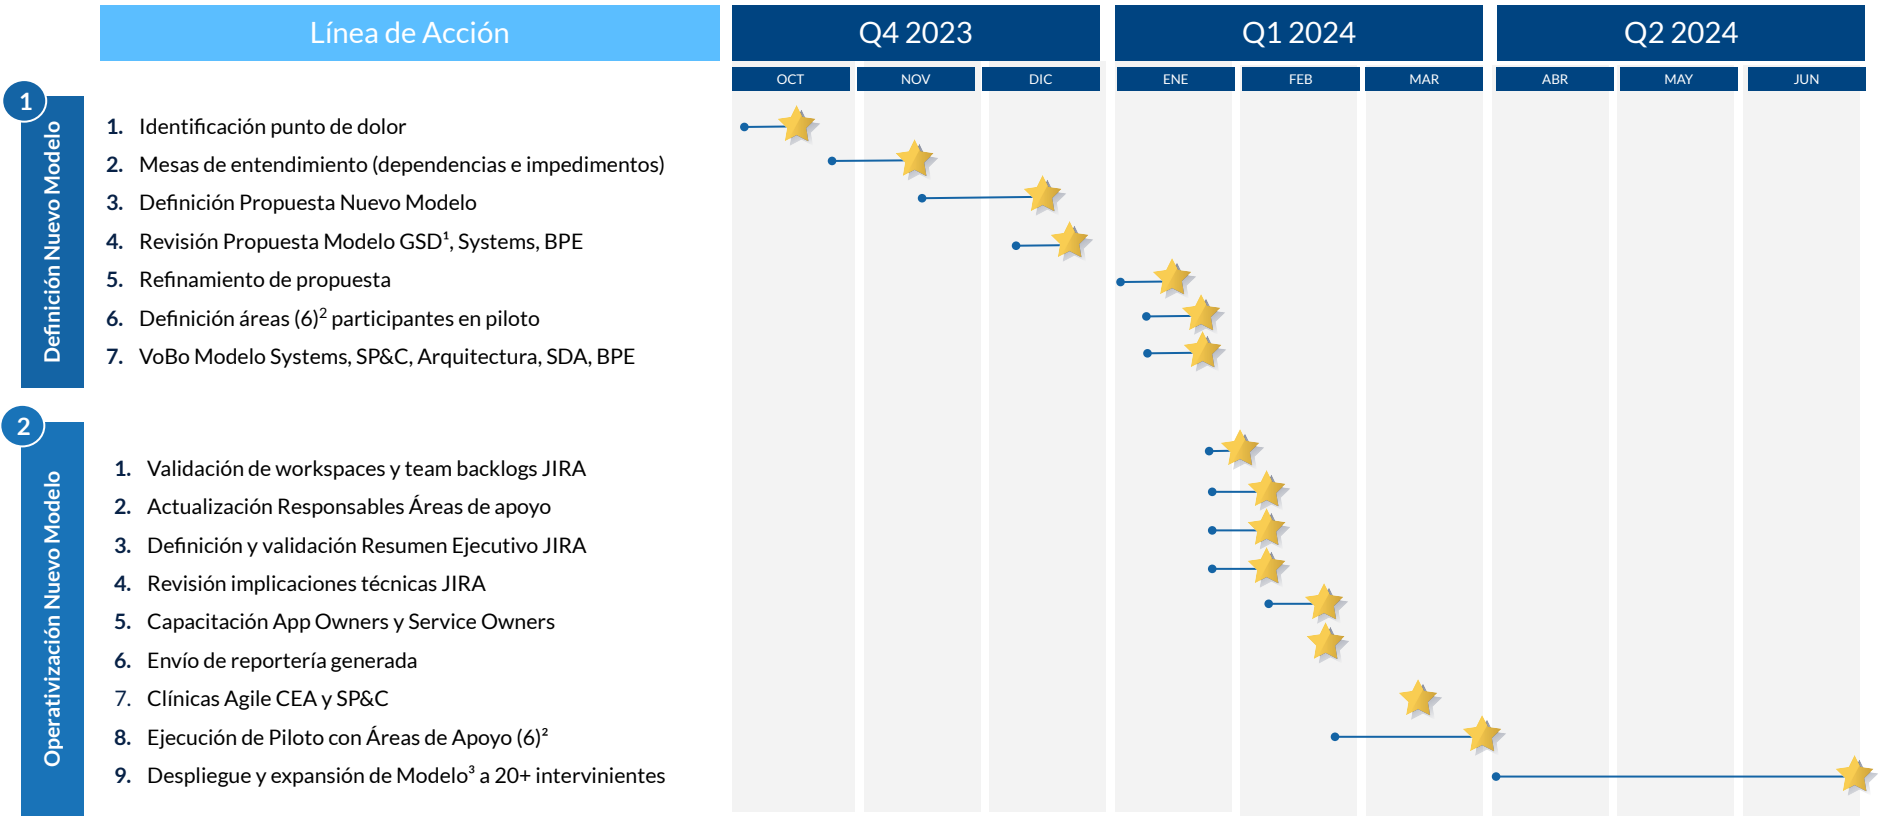


¹ Global Software Development
² Infrastructure & IT Operations, Architecture Engineering, Security Architecture, Contabilidad Corporativa, Legal Services, UX
³ La Expansión estará sujeta a los resultados del piloto

4. Roadmap


Línea de Acción

1. Refinamiento al Modelo con base en hallazgos
2. Presentación de resultados del piloto
3. Presentación a Comité Backlog Management Holding
4. Presentación a Comité GSD Holding
5. Identificación de Áreas de Apoyo para expansión (21 áreas) 
6. Validación de workspaces y team backlogs en JIRA
7. Identificación de responsables Áreas de apoyo
8. Formalización del proceso con REMs y RTEs
9. Formalización de capacitación con App Owners y Service Owners
10. Kick Off de la Expansión
11. Agile Forum con Scrums
12. Seguimiento y refinamiento del Modelo

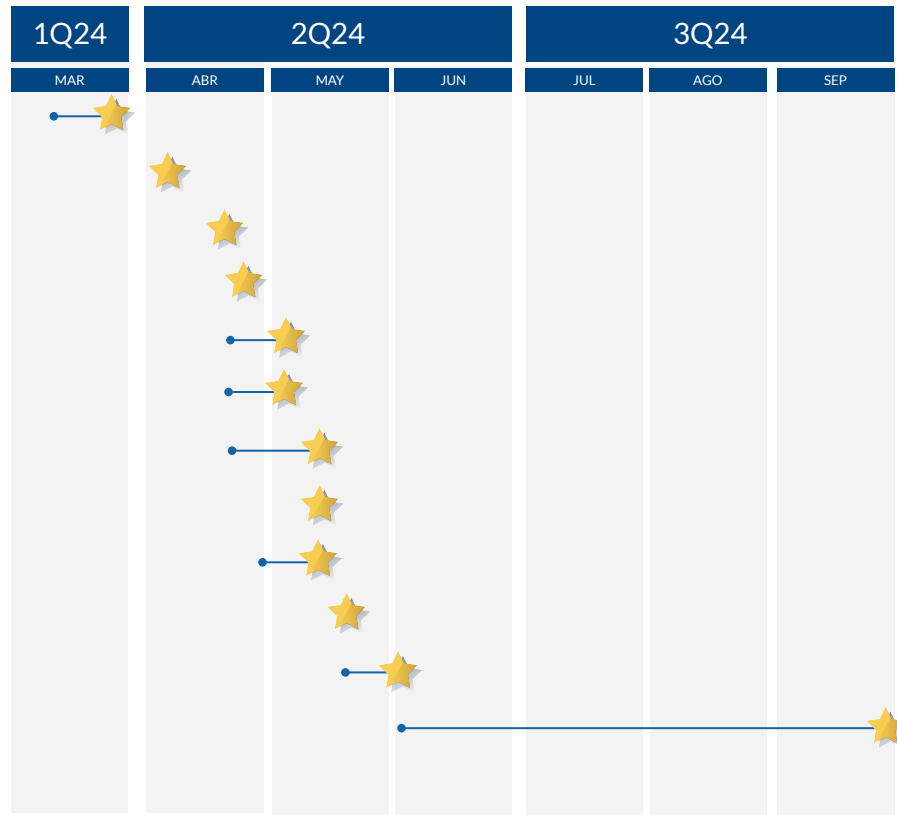

3. Nuevo Modelo de Atención E2E de Dependencias e Impedimento

Implementar el nuevo modelo homologado para la atención de dependencias e impedimentos de los Scrums en JIRA

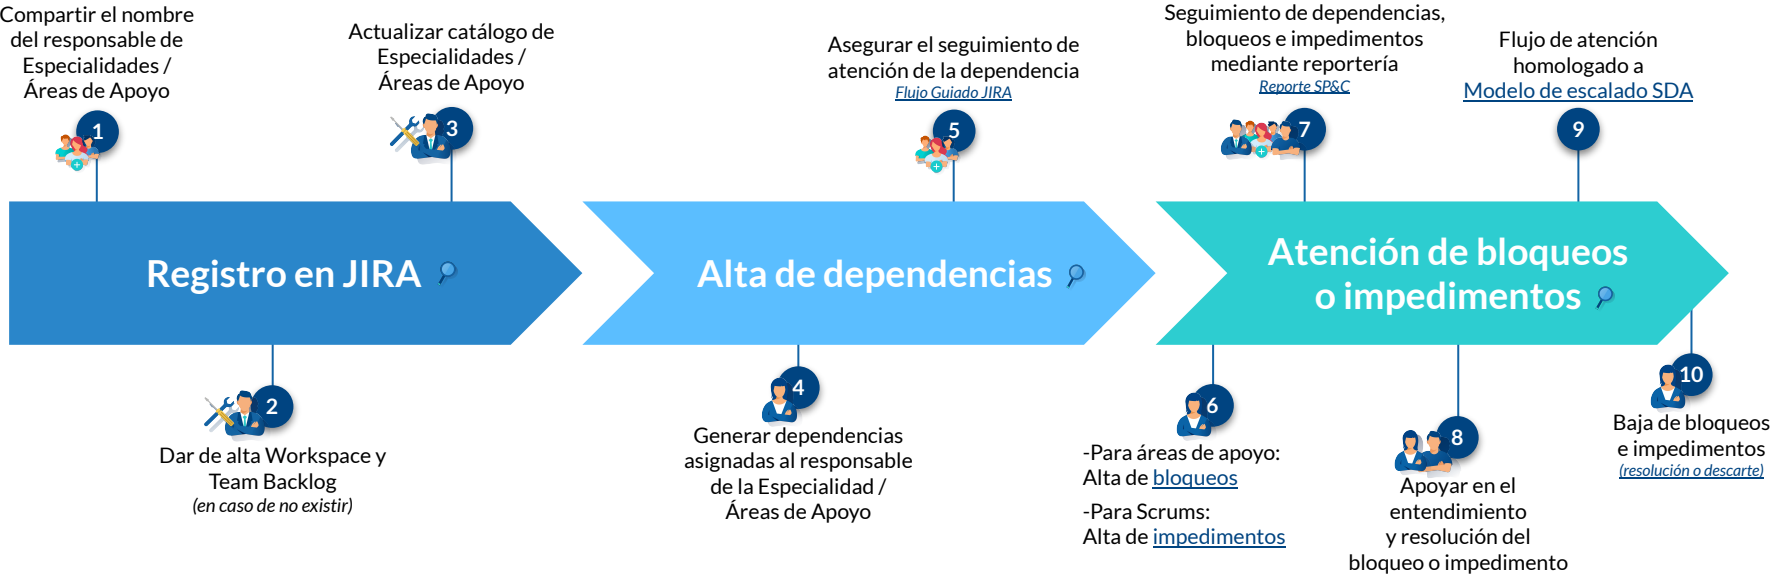

Contenido

1 Antecedentes


2 Resultados Piloto

2 Roadmap



1. Antecedentes: Nuevo Modelo Atención E2E Dependencias e Impedimentos Especialidades/AACC en JIRA

Implementar el nuevo modelo homologado para la atención de dependencias e impedimentos relacionados a las especialidades y áreas de apoyo que atienden a los Scrums en el Proceso de Creación

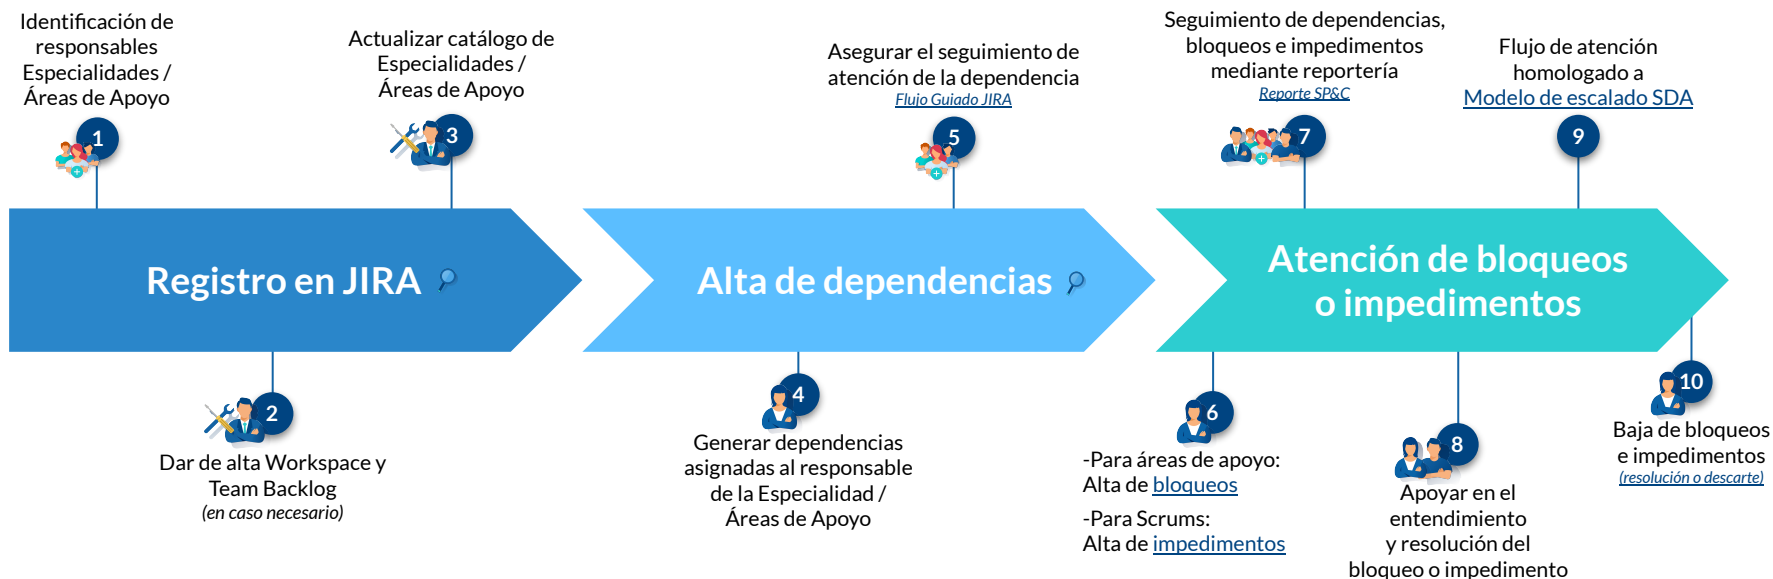

2. Resultados Piloto: Nuevo Modelo Atención E2E Dependencias e Impedimentos Especialidades/AACC en JIRA

26 Febrero- 1 Abril



Intervinientes principales


Áreas de Apoyo (AA)

- 1. **Infrastructure & IT Operations** - Fabian Martinez
- 2. **Architecture Eng** - Manuel Trejo
- 3. **Security Architecture** - Carmina Cecilia Espinosa
- 4. **Contabilidad Corp.** - Elizabeth Rios
- 5. **UX** - Nora Tejeda
- 6. **Jurídico** - Mario Alberto Gloria

Shapers (25 personas)

- Systems Eng** - Rosa Briones, Luz Cuevas
- SP&C** - Olimpia Martinez, Rafa Meza, Alfredo Jimenez
- SDA Office** - Analucia Cuellar, Andrés Neria
- Agile Office** - Francia Fuentes, Roman Cuevas
- BPE** - Laura Santisteban, Hugo Ramos

Avances en Reportería

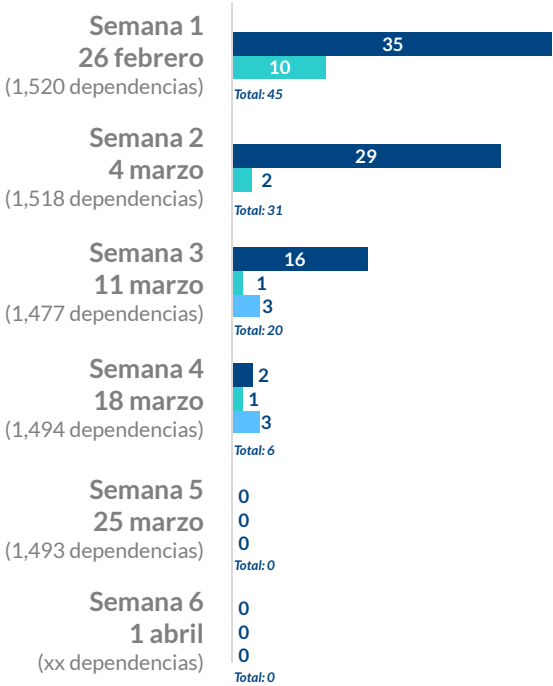

Bloqueos Impedimentos Bloqueos en Arquitectura

Hitos principales

- 24 de enero - Cierre de Modelo
- 09 de febrero - KickOff del piloto
- 26 de febrero - 1er envío de reporte semanal
- 08 de marzo - Documentación de hallazgos
- 11 de marzo - Integración de Tickets Arq.*
- 20 de marzo - Reunión GSD Holding
- 25 de marzo - Refinamiento del Modelo
- TBD - Agile Forum con Scrums

Hallazgos	Solución
1. Complejidad en modelo al manejar 2 conceptos (bloqueos e impedimentos)	1. Simplificación flujo sólo con concepto de impedimentos**
2. Warnings o riesgos que quieren ser considerados como impedimentos	2. Distribución postal con consideraciones de Impedimentos
3. Impedimentos desplazados (riesgo a que no se cierre)	3. Etiqueta para indicar Q en el que se trabaja el impedimento
4. Definición estatus resolved en impedimentos	4. Redefinición de estatus en manuales JIRA
5. Áreas de apoyo que no atienden por JIRA (Jurídico Procurement)	5. Integración al flujo de impedimentos por JIRA


* Atención por tickets en lugar de dependencias **Propuesta GSD Holding Solución Táctica

3. Roadmap: Expansión Modelo Atención E2E Dependencias e Impedimentos Especialidades/AACC en JIRA

Línea de Acción

Expansión del Nuevo Modelo

- 1. Refinamiento al Modelo con base en hallazgos
- 2. Presentación de resultados del piloto
- 3. Identificación de Áreas de Apoyo para expansión (35 áreas) 🔍
- 4. Validación de workspaces y team backlogs en JIRA
- 5. Identificación de responsables Áreas de apoyo
- 6. Reforzamiento de capacitación con App Owners y Service Owners
- 7. Kick Off de la Expansión
- 8. Agile Forum con Scrums
- 9. Seguimiento y refinamiento del Modelo

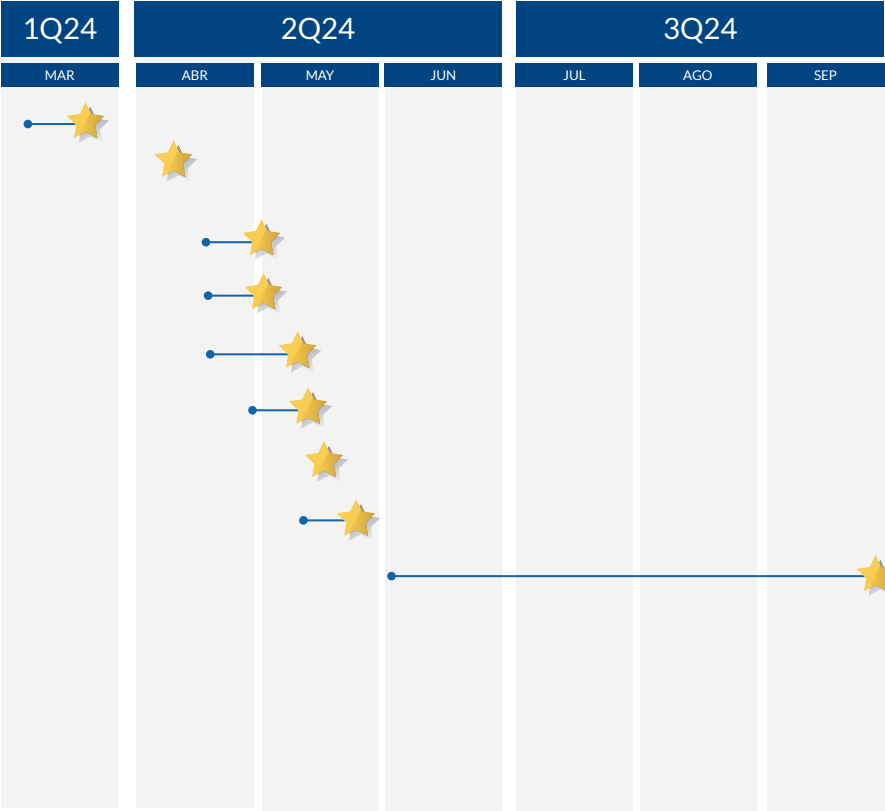


4. Roadmap para Expansión del Modelo

1
Expansión del Nuevo Modelo

Línea de Acción

- 1. Refinamiento al Modelo con base en hallazgos
- 2. Presentación de resultados del piloto
- 3. Identificación de Áreas de Apoyo para expansión
- 4. Validación de workspaces y team backlogs en JIRA
- 5. Identificación de responsables Áreas de apoyo
- 6. Reforzamiento de capacitación con App Owners y Service Owners
- 7. Kick Off de la Expansión
- 8. Agile Forum con Scrums
- 9. Seguimiento y refinamiento del modelo

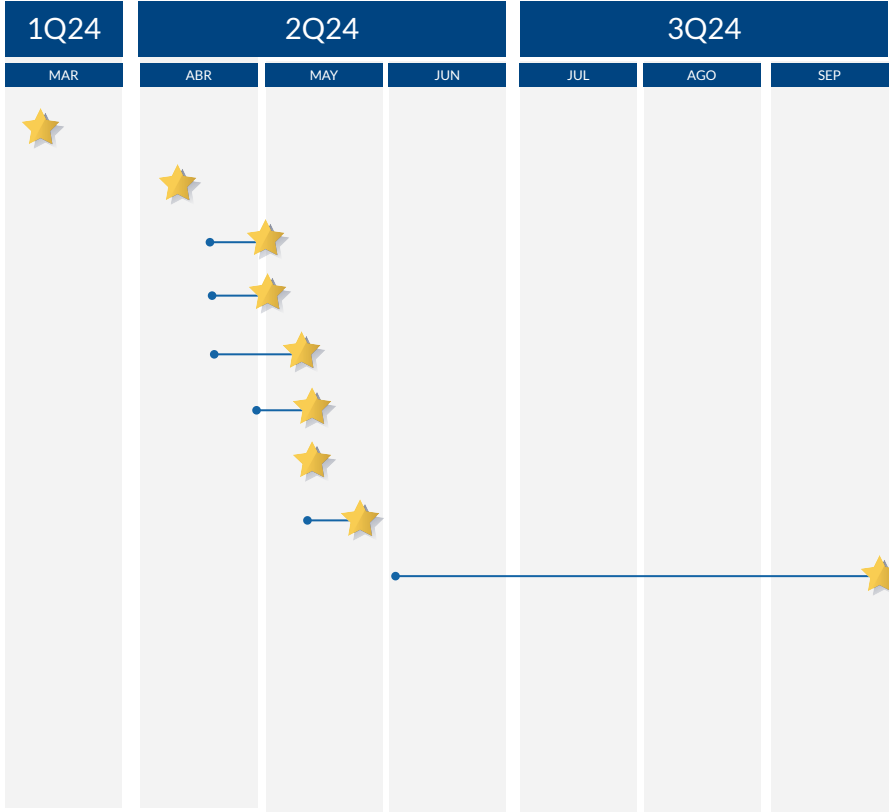

5. Next Steps...

1

Definición de **responsables** para atención de dependencias e impedimentos y accesos a reportería en línea

2

Generación de **puntos de control** para dar seguimiento a Piloto

3

Refinamiento y seguimiento de los **resultados** del Piloto



Creando Oportunidades

Anexos

Registro de Áreas de Apoyo en JIRA

1. Alta de Workspace en JIRA



Intervinientes: Arquitectura JIRA DevOps, Especialidad / Área de apoyo

1. *Arquitectura JIRA DevOps genera Workspace en JIRA para la Especialidad / Área de Apoyo*

2. *Determinar campos:*

- *Nombre de Workspace*
- *Responsable de Workspace*

Project: GTAAS 2.0
Issue Type: Gtaas Workspace
Geography: Mexico
Workspace Name:
Description:
Working Model:
Type:
Workspace Lead / Service Owner:

2. Alta de Team Backlog en JIRA



Intervinientes: SP&C, Arquitectura JIRA DevOps, Especialidad / Área de apoyo

1. *Especialidad / Área de apoyo válida con SP&C (Portfolio Management) que el área se encuentre dentro del [catálogo de Áreas de Apoyo en JIRA](#)*

- *Si aparece en catálogo, cuenta con Team Backlog en JIRA*
- *No aparece en catálogo, Área de Apoyo solicita a SP&C (People Eng) que valide estructura organizativa para autorización*
 - *SP&C (Portfolio Management) agrega Especialidad/Área de Apoyo y Responsable en catálogo*
 - *Arquitectura JIRA DevOps genera alta de Team Backlog en JIRA (NdS= 1 día)*

Project: GTAAS 2.0
Issue Type: Gtaas Team Backlog
Team Backlog Name:
Geography: None
Backlog Type:
Type:
Workspaces:
PO/Team leader:



Alta de Dependencia



Intervinientes: Scrum Master / App Owner (Tech Leads Specialists)

1. Seleccionar la **feature** a cargar la dependencia

2. En Overview presionar **"Create Dependency"**

3. Llenado de campos:

- Summary
- Description
- Petitioner team
- Receptor team (considera Team Backlog de nuevos equipos)
- Acceptance criteria
- Definition of Ready - (insumos)
- Definition of Done - (criterios)
- Priority
- Sprint estimate
- Item type
- Tech Stack
- Story Points
- Function points
- Assignee
- Labels (opcional)
- Impact labels


New

4. Asegurar seguimiento de atención de la dependencia de acuerdo a **Flujo Guiado en JIRA**

Ejemplo ilustrativo:



Flujo Guiado de atención de dependencias en JIRA

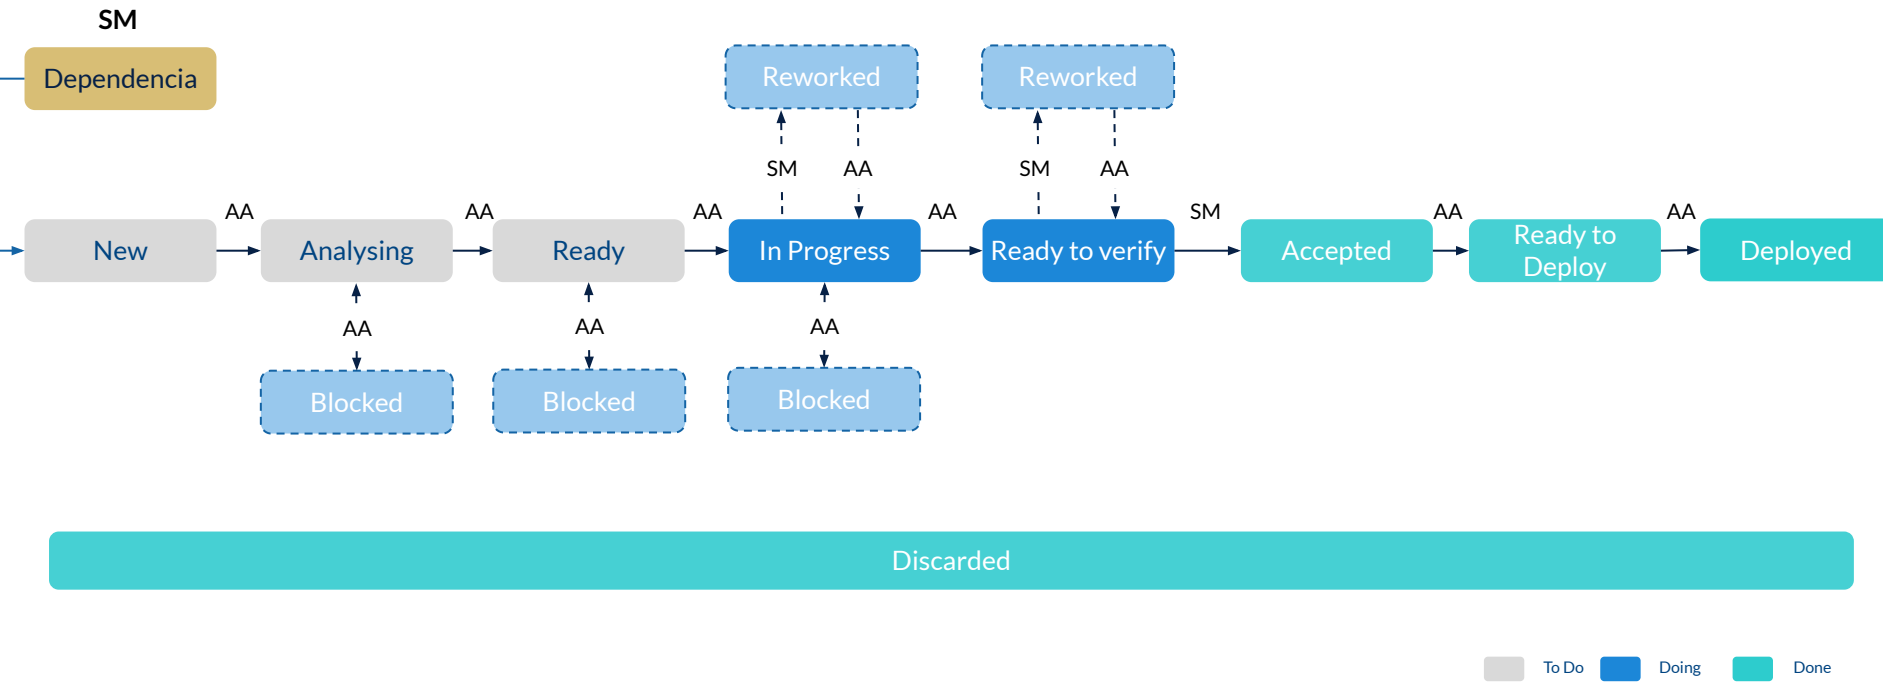

Bloqueos

Estatus dentro del flujo de la dependencia en JIRA y que sirve para informar stoppers sobre la atención de la misma:

- Niveles de servicio excedidos o incumplimiento en fechas de entrega
- Falta de entendimiento y definiciones para la atención
- Insumos o documentación pendiente por el equipo o área de apoyo

No se consideran...

- Riesgos (algo que pueda suceder)
- Solicitudes dentro del nivel de servicio acordado
- Dependencias levantadas de forma extemporánea
- Temas que pueda solucionar el equipo de forma interna

Alta de Status de Bloqueos (Asociado a una Dependencia)

New



Responsables de cambio de estatus: Scrum Master, App Owner, Área de Apoyo

1. Seleccionar la dependencia a la que se carga el bloqueo
2. Modificar el estatus a **"Blocked"**
3. Agregar descripción del bloqueo en **Comments**

México Riesgos / MMR-131862
Dependencia_TF

Edit Add comment Assign More Ready In Progress Workflow

Details

Type:	Dependency
Priority:	High
Affects Version/s:	None
Labels:	2024-Q1
Team Backlog:	México - Canales No Asistidos y Ventas de Cartera
Receptor Team:	México - MEX Branches
Team Backlog Geography:	Mexico

Resolution: Unresolved
Fix Version/s: None

Activity

All Comments Work Log History Activity

anayeli.rivera.contractor added a comment - 16/jan/24 10:29 AM

Se bloquea la dependencia, debido a que de momento no se realizan actividades.

Impedimentos

Issue generado en JIRA asociado a una feature y que sirve para alertar stoppers no asociados a una dependencia:

- Indisponibilidad de herramientas para llevar a cabo un entregable (e.g. entornos)
- Atención de áreas internas que no se dan de alta como dependencias u otros Scrums (e.g. Jurídico, Compliance)
- Atención de entidades externas (e.g. CNBV, INFONAVIT)

No se consideran...

- Riesgos (algo que pueda suceder)
- Solicitudes dentro del nivel de servicio acordado
- Dependencias levantadas de forma extemporánea
- Temas que pueda solucionar el equipo de forma interna

Alta de Impedimentos (No asociado a una Dependencia)

New



Responsables del alta: Scrum Master, App Owner

1. Seleccionar la **feature** a cargar el impedimento

2. En Issues in Epic seleccionar **"Impediment"**

3. Llenado de campos:

-Summary (descripción corta)

-Description (descripción detallada)

-Team Backlog (Scrum que da de alta)

-Problem Solvers (Program Managers, Responsables, Service Owners)

-Assignee (REMs¹ o RTEs)

-Labels (etiqueta del área asociada en caso de aplicar)

New
New
New

Resumen semanal de dependencias e impedimentos




- Cada **lunes** se enviará el reporte de atención de dependencias e impedimentos externos
- **A Quién:** Responsables Workspaces de Áreas de Apoyo
- **Copia:** Service Owners, App Owners (Tech Leads), PO, SM, Program Manager, REM¹, SDA Leader REM¹, Champs, N3
- **Cómo:** Correo Electrónico

Dashboard Atención de bloqueos e impedimentos 🔍

Ejemplo
ilustrativo


Campo	Descripción
SDATOOL	Iniciativa que dio de alta el bloqueo o impedimento
Programa	Programa al que está asociada la iniciativa
Champ	Responsable del Business Value al que está asociada la iniciativa
Iniciativa	Nombre de la iniciativa
Días naturales abierta	Días que han transcurrido desde el alta del impedimento o bloqueo
Días hábiles abierta	Días laborales que han transcurrido desde el alta del impedimento o bloqueo
Status	Estatus o nivel de escalamiento de la dependencia o impedimento
Issue key	Código asociado a la dependencia o impedimento
Created	Fecha de alta
Updated	Fecha de última modificación
Due Date	Fecha en la que se espera resolver el bloqueo o impedimento
Summary	Resumen del motivo de bloqueo o impedimento
Feature link	Feature a la que está asociada
Reporter	Correo de quién dio de alta el bloqueo o impedimento
Assignee	Correo de quien tiene asignado el bloqueo o impedimentos
Priority	Prioridad de la dependencia o impedimento
Team Backlog	Team Backlog del equipo que dio de alta el bloqueo o impedimento
Problem Solvers	Correos de las personas que ayudarán a resolver el bloqueo o impedimento
Labels	Etiquetas asociadas al bloqueo o impedimento

Flujo de seguimiento y escalamiento de impedimentos (Modelo SDA)

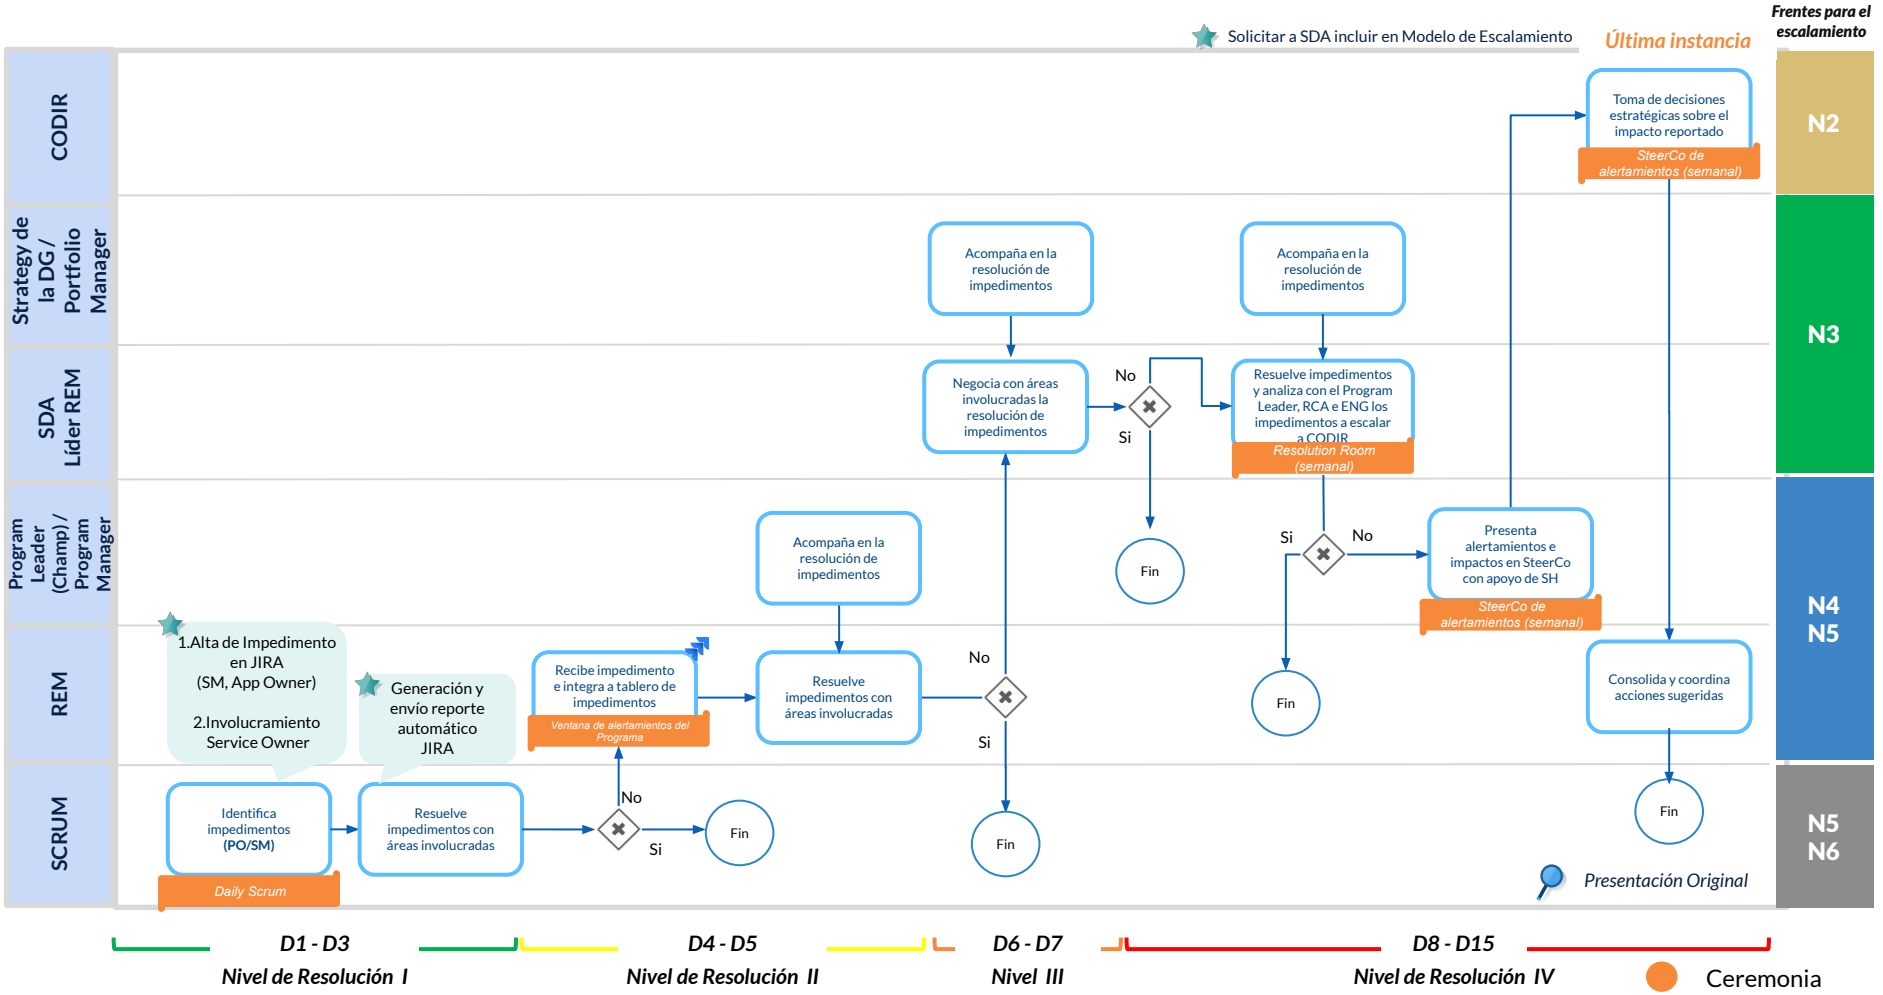

- **Quién:** Scrum Master o App Owner (Tech Leads Specialists) / Usuario que dió de alta el impedimento
- **Cuándo:** cuando el impedimento haya sido resuelto o desestimado

New

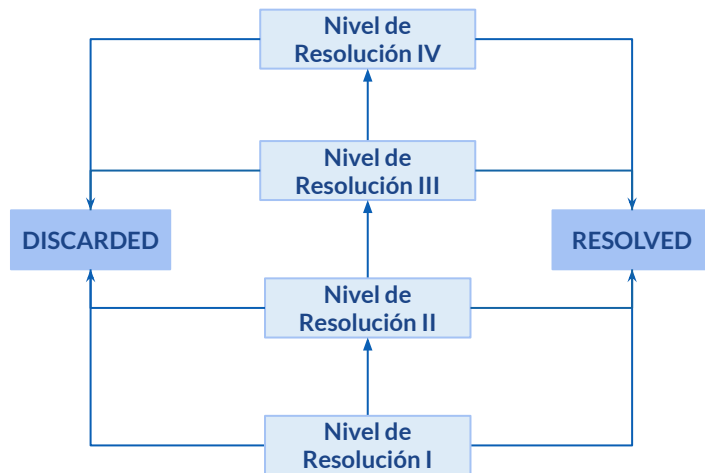

Independientemente del Nivel de Escalado que se encuentre el Impedimento, éste se considerará **resuelto** cuando se haya tomado una decisión al respecto, pudiéndose dar alguno de estos dos **Estados finales**:

RESOLVED.- se ha tratado con los implicados y se ha llegado a un acuerdo para su resolución. Ejemplos:

- Alguna de las partes no llega a un despliegue, se acuerda pasar el despliegue a otra fecha, por lo que se replanifica el entregable y se marca el Impedimento como “Resolved”.

DISCARDED.- Tras estudiar el bloqueo se ve que no aplica el Impedimento. Ejemplos:


- El entregable se ha descartado tras ver la inviabilidad.
- Se necesitaba un desarrollo en una Tecnología que finalmente se ha decidido hacer en otra.

Redefinición de estatus de Impedimentos para Especialidades / Áreas de Apoyo



- **Quién:** Scrum Master o App Owner (Tech Leads Specialists) / Usuario que dió de alta el impedimento
- **Cuándo:** cuando el impedimento haya sido resuelto o desestimado

New

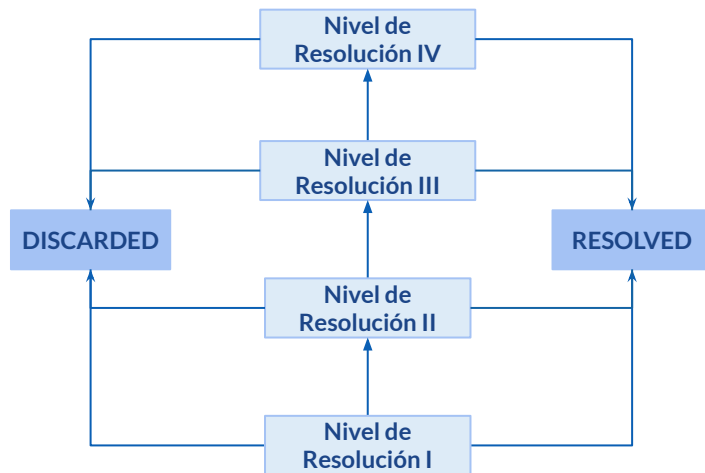

Independientemente del Nivel de Escalado que se encuentre el Impedimento, éste se considerará **resuelto** cuando se haya tomado una decisión al respecto, pudiéndose dar alguno de estos dos **Estados finales**:

RESOLVED.- se ha llegado a un acuerdo con los implicados para su resolución.

- Se acuerdan actividades con el área de apoyo a realizar para llegar al despliegue o avanzar en el desarrollo y se marca el Impedimento como “Resolved”.

DISCARDED.- Tras estudiar el impedimento se ve que no aplica el Impedimento.

- El entregable se ha descartado tras ver la inviabilidad.
- Se necesitaba un desarrollo en una Tecnología que finalmente se ha decidido hacer en otra.

Áreas de Apoyo faltantes




Áreas de Apoyo			
1	Systems Engineering	20	Experiencia Única
2	Data Engineering	21	GRO
3	Architecture	22	Information Security
4	Information Security	23	Legal Services
5	BPE	24	Marketing & Digital Sales
6	Operations	25	Design & UX
7	Corporate Security	26	Minorista / Individual Risk
8	Infrastructure & IT Operations	27	MIS
9	Financial Crime Prevention	28	Nuevos Negocios Digitales e Inclusión Financiera
10	A&GD & M&AS	29	Producción y Control Interno Financiero
11	Antifraud Governance	30	Riesgos Particulares
12	Architecture & Global Deploy	31	Riesgos
13	Banca de Empresas y Gobierno	32	Riesgos RSG
14	Capacity & Performance Management	33	Security & Protection Mex
15	Arquitectura Contable	34	Global (Systems)
16	Crédito y Medios de Pago	35	Infraestructura Holding
17	Customer Care Center		
18	Customer Relationship Management		
19	Engineering Risk & Corporate Assurance		

Redefinición de estatus de Impedimentos para Especialidades / Áreas de Apoyo



- **Quién:** Scrum Master o App Owner (Tech Leads Specialists) / Usuario que dió de alta el impedimento
- **Cuándo:** cuando el impedimento haya sido resuelto o desestimado

New

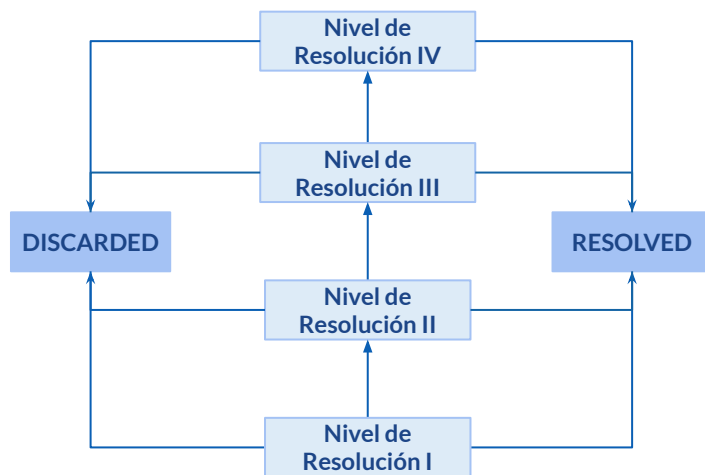

Independientemente del Nivel de Escalado que se encuentre el Impedimento, éste se considerará **resuelto** cuando se haya tomado una decisión al respecto, pudiéndose dar alguno de estos **tres Estados finales**:

RESOLVED.- se ha tratado con los implicados y se ha llegado a un acuerdo para su resolución. Ejemplos:

- Alguna de las partes no llega a un despliegue, se acuerda pasar el despliegue a otra fecha, por lo que se replanifica el entregable y se marca el Impedimento como "Resolved".

DISCARDED.- Tras estudiar el bloqueo se ve que no aplica el Impedimento. Ejemplos:

- El entregable se ha descartado tras ver la inviabilidad.
- Se necesitaba un desarrollo en una Tecnología que finalmente se ha decidido hacer en otra.

DESPLAZADO.-

Listado de Service Owners

Gremio	Especialidad	Service Owner
Retail Systems Maria Norma Méndez López	Web	Jose Manuel Zulaica Rugarcia
	Mobile Retail	Francisco Enrique Galicia Parada
	Branches	Humberto Yahveh Cureño Martínez
	CRM	Rogelio Aco González
	Open Market	Dolores Castro Lara
Enterprise Systems Luis Enrique Rocha Guizar	Consumer Finance	Aldo González Sandoval
	Enterprise Web	Karina Bahena Gómez
	Branches	David Téllez Alegría
	Specialized Products	María Aurora Alcántara Villegas
	Mobile Enterprise	Cuauhtémoc Rodríguez Bravo
Insurance Systems Luis Alejandro Orihuela Hidalgo	API Channel	Arturo Olvera Zaldívar
	Channels	César Eduardo Flores Barreto
	CRM	José Valdemar Martínez Paz
	Core Cross	Aldo González Sandoval
	Informational	Frida Salazar
C&IB Systems Francisco Cuesta Sánchez	Multiasistance and Pensions	Jesús Francisco Martínez García
	FX, Derivatives & Custody	Luis Efren Bollain y Goytia Meza
	Equity	María del Refugio Rodriguez Gonzalez
	Cross & Lending	Marchello Harfuch Hernandez
	OTC & Risk	Erick Said Franklin Zamora
	FI & Reporting	Wendy Veronica Martinez Guzman
	Asset Management	Carlos Manuel Heras Toledano
	Private Banking	Eleazar Agustín Ramírez

Gremio	Especialidad	Service Owner
Corporate Functions Systems Cecilia Martinez Davila	Talent & Culture	José Santos Mora Duarte
	Compliance & Legal	Guadalupe Elizeth Fajardo Martínez
	Risk	José Lenin Ruiz Vázquez
	AACC	María Sabina Diana Trejo Reynoso
	Finance & Procurement	Bibiana Muñiz Padilla
Core Banking Products Yudith Gómez Rubio	Local Services	Yazmín Salas Guzmán
	Credit Acquisition & Aut.	Victoria del Carmen Hernández Retana
	Accounts	Rafael Bustamante Rodríguez
	Loans / Lending	César Javier Juárez Gutiérrez
	Contracting and Authentication Modules	Héctor Gonzalo Ramírez Memije
Core Cross Systems José María Suzuki González	Client Infrastructure	Verónica Sánchez Dávila
	Payrolls and Transfers	Osvaldo Martínez Bucio
	ATMs & Infrastructure	Marco Antonio Gutiérrez Márquez
	Contact Center & Claims	Jorge Pedraza Ramirez
	Account Statements & Tax Stamps	Blanca Lilia Camarena Reyes
Payments Systems Jeremy Sylvain Berras	Digital Contactability	Edith Guerrero Huerta
	Applications Security	Francisco Eduardo Hernandez Portillo
	Multiasistencia	Diana Sánchez Sánchez/ Jesús Francisco Martínez
	SPEI / SPID / COD	Rogelio Mendoza Santos
	Transactions Engine	Uriel Moreno Gómez
	Merchants	Ulises Joaquín Espinosa
	Payment Credits	Benjamín Trujillo Beltrán
	Payment Methods	Mauricio Baeza Vazquez



Listado de App Owners (Tech Lead Specialists)(1 de 2)

Gremio	Especialidad	Nombre
(K1) Retail Systems	(K1-5) Web	Giovanni Nicolas Marin
		Alejandra Eutimio Reyes
		David Bernal Paez
	(K1-6) Mobile Retail	Omar Cedillo Leyva
		Benjamin Sanchez Zebadua
		Urvelio López Fermin
		Jose Daniel Montes Peralta
		Adriana Hernandez Pascacio
	(K1-7) Branches	Jesus Mateo Tiburcio
		Levi Dasaev Vazquez Flores
		Guillermo Querea Sosa
	(K1-8) Open Market	Luis Eduardo Hernandez Becerra
		Ana Karen Esteban Ortiz
		Rocio Bermudez Bravo
	(K1-9) CRM	Angel Arturo Cortes Lozano
		Diana Espinoza Jimenez
		Juan Alberto Tapia Lara
(K2) Enterprise Systems	(K2-5) Consumer Finance	Marco Antonio Ramirez Carbajal
		Guillermo Guzman Quezadas
		Hector Perez Lazcano
	(K2-6) Enterprise Web	Alejandro Gonzalez Venegas
		Dulce Maria Tenorio Rosas
		Fabian Fernando Huerta Palacios
		Vanesa Bonfil García
		Raul Isshael Rosales Ortiz
	(K2-7) Digital Work Place & CRM	Inés Marquez Hernández
		Sergio Contreras López
		Alejandro de la Cruz Hernández
	(K2-8) Specialized Products	Rosendo Dorantes Vega
		Fabian Fernando Huerta Palacios
		Eduardo Garcia Martinez
	(K2-9) Mobile Enterprise	Armando Alejandro Brito Cruz
		Gabriel Olivares Ceja
		Omar Flores Segura
	(K2-10) Specialized Products	Juan Rodrigo Irala Endo
		Minerva Elizabeth Cedillo Cazares
		Roberto Arreola Cortéz

Gremio	Especialidad	Nombre	
(K3) Insurance Systems	(K3-5) Channels	Fernando Manuel Maria B Aldo Dominguez Queza Diego Roberto Pichardo Ro Said Muñoz Chavez	
	(K3-7) Core Cross	Jose Valdemar Martinez Paz FAUSTO CARCAMO PEREZ ANGEL ESCOBAR RUIZ	
	(K3-8) Informational	Fernando Delgado Galindo	
	(K4-4) FX, Derivatives & Custody	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MARTINEZ	
	(K4-5) Equity	Eduardo Huerta Arellano DAVID SANCHEZ COETO	
(K4) C&IB Systems	(K4-6) Cross & Lending	Rodrigo Alejandro Tapia Acuña Arlette Rivera Mendoza Maria de Lourdes Ruvalcaba Ruiz Dulce A. De Leon Fuentes	
	(K4-7) OTC & Risk	Antonio de Jesus Rios Fraga LILIANA PEREZ YAÑEZ Noril Yasodhara Gallegos Camacho	
	(K4-8) FI & Reporting	Jose Antonio Cisneros Alvarez Froylan Neri Mejia Vazquez Santiago Alan Pacheco Ramos	
	(K4-9) Asset Management	Alfredo Torres Beltran Ruben Reus Uribe	
	(K4-10) Private Banking	Jose Jacobo Najera Garcia Martin Monroy Mejia Julio Cesar Ávila Almaraz	
	(K5) Corporate Functions Systems	(K5-5) Talent & Culture	Oscar Alberto Nogales Ramirez OSCAR VAZQUEZ PEÑA SALVADOR SERRANO GALVEZ
		(K5-6) Compliance & Legal	Elideth Antonio Mendoza Luis Ricardo Martinez Hernandez Eliel Lopez Garrido
		(K5-7) Risk	Lourdes Carolina Quijano González Maria Itzel Meneses Martínez CRUZ ADAN SANCHEZ GONZALEZ
		(K5-8) AACC	ERIKA GRANDE SANCHEZ Francisco Daniel Gomez Soto JOSE MONTOYA GUZMAN
		(K5-9) Finance & Procurement	Victor Antonio Espinosa Alva Alejandro Andrade Pantiga JUAN ANGEL CERVANTES VILLANUEVA
(K5-10) Local Services		AIDA ARACELI ESPINOZA SANCHEZ Mayra Valeria Colin Montenegro LIZBETH CRUZ BARRAGAN	

ACTUALIZADO A
Marzo 2024

Listado de App Owners (Tech Lead Specialists)(2 de 2)

Gremio	Especialidad	Nombre
(K6) Core Banking Products	(K6-5) Accounts	Claudia Tomasa Resendiz Ugalde
		Gabriela Cristina Vázquez García
		Martín Oliver Morales
		Yazmin Tirado Avalos
		ANGELICA ZARCO JIMENEZ
	(K6-6) Payrolls & Transfers Systems	Nancian Citlalli Caballero Fernandez
		Víctor Cervantes Castellanos
		Jesus Fernando Mejia Baca
		Alvaro Cruz Pichardo
		Gaciel Pacheco Cruz
(K7) Core Cross Systems	(K6-7) Loans / Lending	Rafael Cuautli Rojas Jimenez
		RAFAEL ARTURO FERNANDEZ OVIEDO
		Luis Uriel Guerrero Garcia
		Claudio Guerrero Guerrero
		Jonathan Animas Jimenez
	(K6-9) Contracting and Authentication Modules	Joe Valentin González
		Javier Oswaldo Romo Velazquez
		Ulises Noe Mata Bautista
		JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ
		Eric Acosta Vega
(K7) Core Cross Systems	(K6-10) Client Infrastructure	Laura Angelica Colin Romero
		Alejandro Muñoz Morales
		FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
	(K7-5) ATMs & Infrastructure	Enrique Perez Valdez
		Luis Arturo Díaz Montes de Oca
		Mariano Torres Urbiola
		FIDEL VILLALOBOS MARTINEZ
		MARIA DE LOURDES SANTIBAÑEZ MUÑOZ
	(K7-6) Contact Center & Claims	JESUS FRANCISCO MARTINEZ GARCIA
		IVAN DE JESUS BUENDIA GRANILLO
		Juan de Dios Alba Ortega
		Jesús Gustavo Villeda Guzman
(K7) Core Cross Systems	(K7-8) Accounts Statements & Tax Stapsms	MARIANA VIDAL PRADO
		Héctor Martínez García
		Victor Manuel Rodriguez Rodriguez
		Alfonso Garrido Reyes
		Carlos Alberto Montiel Macías
	(K7-11) Digital Contactability	Jesús Cristian Jiménez Damian
		Carlos Mujica Mota
	(K7-12) Multiassistance and Pensions	

Gremio	Especialidad	Nombre
(K8) Payments Systems	(K8-5) Banxico / SPEI / SPID / CODI	ARACELI REYES
	(K8-8) Credits	Arturo Nieto Ponce
		Juan Alberto Rojas Ballesteros
		Agustina Rodríguez López
		José alberto Olalde Méndez
		Luis Antonio Palma Lule
	(K8-9) Merchants	Gabriela Jiménez García
	(K8-10) Payment Methods	Cintya Barrera González
		Marco Polo Rangel Acevedo
		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SEGURA
Jorge Alejandro Sánchez Heredia		
(K8-11) Transactions Engine	Sandra Guadalupe Sanjuan Santiago	
	RICARDO ENRIQUE CERRITOS VALENCIA	
	Jose Miguel Osorio Moreno	
(K8-12) Payments Subscription & Service	Noe Israel Rivera Osornio	
	Pablo Saul Ramirez Ramirez	
	(K9-2) Automation	Angel Sánchez Rueda
		Isaac Barranco Serrano
		Galdino Jimenez Pineda
(K10) Security Systems	(K10-1) Application Security	Rodrigo Díaz de León Reyes
		Eliana Cecilia Van Der Velde

ACTUALIZADO A
Marzo 2024

- Mexico - Fábrica de Pruebas
- Mexico - Test Automation

Resultados del Piloto del Nuevo Modelo de Atención de Bloqueos e Impedimentos (26 feb - 25 mar)

Intervinientes principales


Áreas de Apoyo (AA)

- 1. **Infrastructure & IT Operations** - Fabian Martinez
- 2. **Architecture Eng** - Manuel Trejo
- 3. **Security Architecture** - Carmina Cecilia Espinosa
- 4. **Contabilidad Corp.** - Elizabeth Rios
- 5. **UX** - Nora Tejeda
- 6. **Jurídico** - Mario Alberto Gloria

Shapers (25 personas)

- Systems Eng** - Rosa Briones, Luz Cuevas
- SP&C** - Olimpia Martinez, Rafa Meza, Alfredo Jimenez
- SDA Office** - Analucia Cuellar, Andrés Neria
- Agile Office** - Francia Fuentes, Roman Cuevas
- BPE** - Laura Santisteban, Hugo Ramos

Avances en Reportería

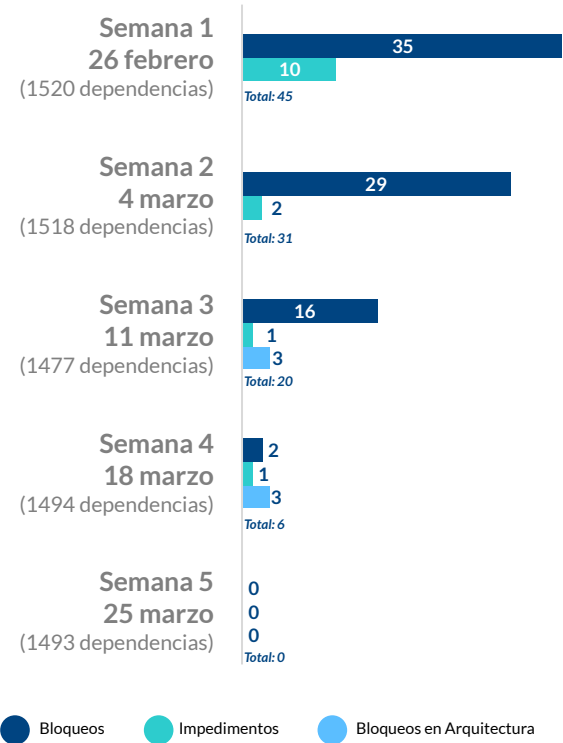

Hitos principales

- 24 de enero - Cierre de Modelo
- 09 de febrero - KickOff del piloto
- 26 de febrero - 1er envío de reporte semanal
- 08 de marzo - Documentación de hallazgos
- 11 de marzo - Integración de Tickets Arq.*
- 20 de marzo - Reunión GSD Holding
- TBD - Agile Forum con Scrums

Hallazgos

- 1. Complejidad en modelo al manejar 2 conceptos (bloqueos e impedimentos)
- 2. Warnings o riesgos que quieren ser considerados como Impedimentos
- 3. Impedimentos desplazados (riesgo a que no se cierre)
- 4. Definición de estatus resolved en impedimentos
- 5. Áreas de apoyo que no atienden por JIRA

Solución

- 1. Alta de impedimentos por Scrums (Feature, HU, Dependencia)**
- 2. Distribución de postal con consideraciones de Impedimentos
- 3. Etiqueta para indicar Q en el que se trabaja el impedimento
- 4. Redefinición de estatus en manuales JIRA
- 5. Integración al flujo de impedimentos por JIRA

* Atención por tickets en lugar de dependencias

**Propuesta GSD Holding

Alta de Impedimentos en JIRA

Alta de Impedimentos



Responsables del alta: Scrum Master, App Owner

1. Seleccionar la **feature** a cargar el impedimento

2. En Issues in Epic seleccionar **"Impediment"**

3. Llenado de campos:

- Summary (descripción corta)
- Description (descripción detallada)
- Team Backlog (Scrum que da de alta)
- Problem Solvers (Program Managers, Responsables, Service Owners)
- Assignee (REMS¹ o RTEs)
- Labels (etiqueta del área asociada en caso de aplicar)

4. Una vez que se genere el impedimento, ingresar a la opción Link dentro del menú desplegable de More

5. Ingresar en la ventana de Link el issue key del elemento (HU, Dependencia, Feature) afectado

Ejemplo ilustrativo:

1. Issues in epic


2. Create Issue

3. Summary: [XBTQ-ESP] Carga multicif
Description: Actualmente los usuarios se ingestan TODOS incluyendo los multicif. Los multicif se cargan con un customerID que se refiere a un CIF. Esto, habilita el login de Empresas para todos los usuarios.
Priority: Blocker
Team Backlog: Spain - ARC Workplace
Problem Solvers: bernardo.ruiz, arquitecturados.holding
Assignee: bernardo.ruiz
Labels: #ARCHITECTURE, #INGENIERIA

4. Details: Type: Impediment, Priority: Medium, Affects Version/s: None, Labels: #INFRA, #Impediment, Team Backlog: Mexico, Team Backlog Geography: Mexico, Workspace Geography: Mexico, Feature Link: Desarrollo de la [Link]
Description: Se presenta inestabilidad en el ambiente de pruebas dentro de los aplicativos de EECG y AACG.

5. Link

Modelo de escalamiento para dependencias e impedimentos

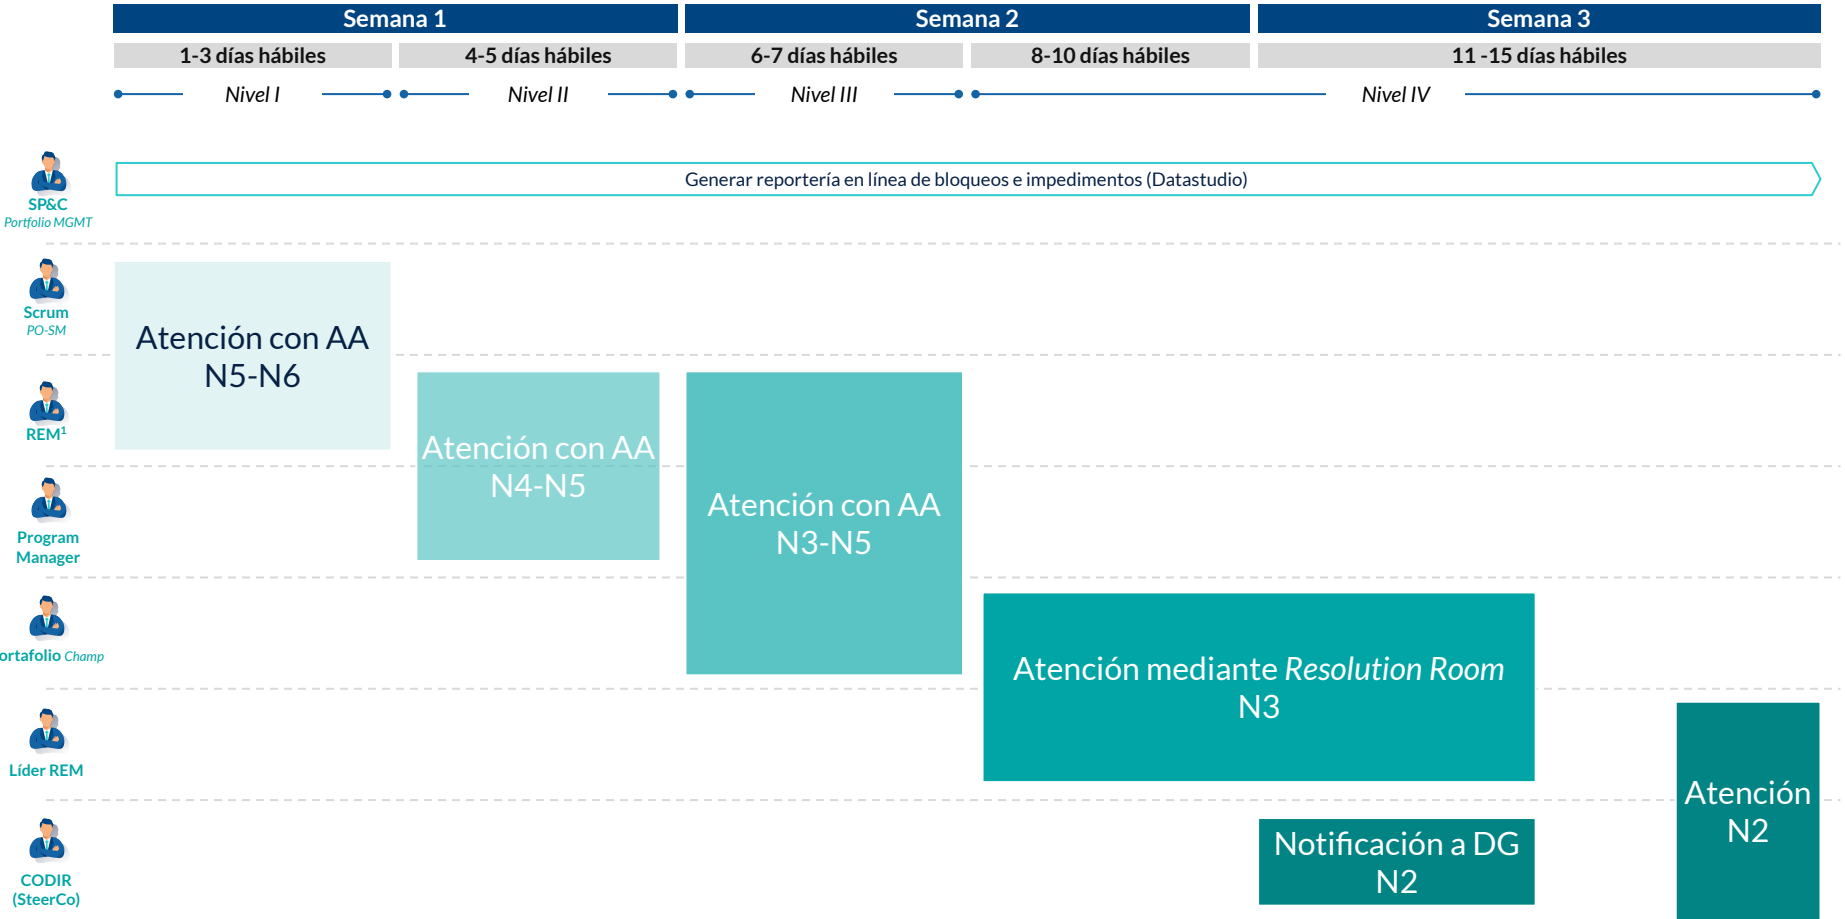

Especialidades / Áreas de apoyo consideradas en el piloto (vista catálogo Áreas de Apoyo en JIRA)



Área		Gremio	Team Backlog JIRA	Responsable
1	Infrastructure & IT Operations	Infrastructure & IT Operations	Mexico - I&O - Network & Tech. Support	Andrei Perea Romero
			Mexico - I&O - IT Operations	
			Mexico - I&O - Workplace	
			Mexico - I&O - Resilience & Business Continuity	
2	Architecture Engineering	Workplace	Mexico - MEX Workplace	Carlos Aaron Castillo Lechuga
		Workplace	Mexico - MEX ECS	Daniel Hernandez Huitron
		BPA & AI Automation	Mexico - MEX BPM	Efrén Arturo Morales Arredondo
		BPA & AI Automation	Mexico - MEX Digitalización	Omar Hiram Escalante Molina
		BPA & AI Automation	Mexico - MEX Blockchain	Marco Antonio Belmont Partida
		BPA & AI Automation	Mexico - MEX Robotics	Israel Fuentes Avila
		BPA & AI Automation	Mexico - MEX Capa Gestora	Israel Fuentes Avila
		BPA & AI Automation	Mexico - Mex Inteligencia Process	Roberto Vásquez Jiménez
		Data Architecture	Mexico - MEX Data Architecture	José Raúl Aoki Rodríguez
		Alpha	Mexico - MEX Backend Canales	Gerardo Humberto Mugica de la Fuente
		Alpha	Mexico - MEX Integración de Arquitectura	Oscar Gonzalo Torres Arenas
		Alpha	Mexico - Arquitectura ASTA	Francisco Javier Ruelas Verdugo
		Alpha	Mexico - Tablas Corporativas	Jonathan Vigueras Barrios
		Alpha	Mexico - Arquitectura Aplicativa Alpha	Berenice Santacruz Portillo
		Alpha	Mexico - Streaming & Capa Gestora Host	Juan Carlos Hernández Barajas
		Solutions Architect	Issue Analysis - Decision Framework	Manuel Trejo González
3	Security Architecture	Channels Architecture	Mexico - MEX Channels Architecture	Fernando Díaz Godoy
		IT Gov & DevOps	Mexico - MEX IT Gov & DevOps	Gustavo Díaz
4	Arquitectura Contable	Cyber Security	Mexico - Mex Security Architecture	Marco Antonio León
		Contabilidad Corporativa	Mexico - Mex Administración y Finanzas	Carlos Luna
5	Jurídico	Contabilidad Corporativa	Mexico - Mex Consolidación Área Técnica y Criter Internacionales	Jared Saul Olivan Altamirano
		Jurídico Banca de Consumo	Mexico - Mex Operaciones Pasivas (captación) y de Servicios	Wendy Denisse Ríos Salazar
		Jurídico Banca de Consumo	Mexico - Mex Operaciones Activas (Créditos)	Roberto Michell Rojas Klee
		Jurídico Banca de Consumo	Mexico - Mex Seguros y WIBE	Manuel Medina Lanzagorta
		Jurídico Banca de Consumo	Mexico - Mex Banca digital	Karla Ruiz Román
		Jurídico Procurement	Mexico - SD Inmuebles	Elizabeth Rivera Noguez
		Jurídico Procurement	Mexico - SD Tecnología	Daniela Gómez Nivón
		Jurídico Procurement	Mexico - SD Compras Generales	Miguel Angel Monjaraz
6	UX	Marketing & Digital Sales	Mexico - Mex Design & UX	Mariana Robles
				Eduardo Monterrosas
				Ilse Carolina Rosas Flores
				Ana Kristal Moreno Sanchez
				Ramses Ulises Rivera Romo



Directorio de Especialistas / Áreas de Apoyo en Piloto

Especialistas / Áreas de Apoyo		Impediment Labels
1	Architecture Engineering	#ARQ_Impediment
2	Cyber Security	#CYBER_Impediment
3	Infrastructure & IT Operations	#INFRA_Impediment
4	Design & UX	#UX_Impediment
5	Finanzas (Arquitectura Contable)	#FIN_Impediment
6	Jurídico (Legal Services)	#JUR_Impediment
7.	Jurídico (Procurement)	#JURPROC_Impediment

Agenda - 16 de febrero

- 1 Definición de Responsables
- 2 Actualización Roadmap
- 3 Definiciones de Bloqueos e Impedimentos
- 4 Next Steps...



4. Next Steps... (16 de febrero)

1

Cierre de **Responsables** para las áreas participantes

2

Capacitación de **Service Owners** y revisión de ajustes a **material de capacitación JIRA**

3

Inicio de revisión de bloqueos e impedimentos del **Q2 2024**

Agenda - 23 de febrero

- 1 Coordinación Clínica Agile
- 2 Actualización de Roadmap
- 3 Bloqueos identificados en el Reporte
- 4 Next Steps...



3. Bloqueos e Impedimentos Identificados en el Reporte

Con apoyo del equipo de SP&C, se detectaron los siguientes bloqueos e impedimentos registrados en JIRA

Número de Bloqueos e Impedimentos identificados por Área de Apoyo perteneciente al piloto

	Bloqueos	Impedimentos
Architecture Engineering	25	7
Security Architecture	36	-
Infrastructure & IT Operations	-	2
UX	-	-
Legal Services	-	-
Contabilidad Corporativa	-	-
Total	61	9

Detalle por Programa

Detalle Bloqueos		Detalle Impedimentos	
Horizon	11	Horizon	2
Financial Crime Prevention	7	Next Gen Architecture Evolution	2
Retail Digital Channels: GloMo	6	Data Centers Steel	2
Enterprise Digital Channels	5	ATMs	1
Processes and Digital Transformation	4	NFR Management Infra & Methodologies	1
DIY Products	4	Obsolescencias	1
NFR Infra Management & Methodologies	4		
Otros (13)	20		

Detalle por tiempo transcurrido (días hábiles)

Nivel I (1-3)	Nivel II (4-5)	Nivel III (6-7)	Nivel IV (8-15)	+15 días
4	5	2	8	51

4. Next Steps... (23 de febrero)

1

Cierre de consultas sobre **tickets de análisis** (Arquitectura)

2

Definición de Responsable para **Jurídico Procurement**

3

Informar a Scrums sobre el Nuevo Modelo en **Clínicas Agile**

Agenda - 01 de marzo

1 Tickets de Análisis para Arquitectura

2 Inclusión de Jurídico Procurement

3 Clínicas Agile

4 Next Steps...



1. Inclusión de tickets de análisis al dashboard

Alta de bloqueos en tickets de análisis



Intervinientes: Scrum Master / App Owner (Tech Lead Specialist)

1. Ingresar al **Enterprise** en la sección de **Issue Links**
2. Buscar la tarea de análisis con el icono **"AN"**
3. Cambiar el estatus a **Blocked**

Projects Issues Projectrak Boards Structure #ONE eazyBI Create

EZE Process / EZE-237988

Transformación ATMs: Consulta Global NextGen

Edit Add comment Assign More Analysis To Do Analysis In Review Workflow

Details

Type: AN Analysis 2.0 Status: ANALYSIS IN PROGR... (highlighted with a red box)

Resolution: Unresolved

Labels: Enrique P11Q24 Squad_Inquisitors shadowCCS

Analysis Decision Framework Solution Model IT Risk Admission

Country Sponsor: Mexico

Domain: Engineering

Description

Para el canal ATM se requiere la transformación del canal, en el servicio de Consulta Global, se implantará esta iniciativa, Transformación ATMs: Consulta Global NextGen, desarrollando la migración del servicio de Consulta Global del cliente en ATM (que tiene inmerso, consulta de Saldo, Disponible de efectivo a retirar en función del cajero y parametria tarjeta, datos de cliente, cuentas asociadas, etc..., esperando mejorar en apoyo en transformación de canal de autoservicio hacia plataforma nextgen, APIficando la funcionalidad y generando la reducción de 15% de ejecuciones de MDIE y MIPs por ser Tx Mainframe.

Attachments

1

Inclusión de tickets de análisis al Datastudio de SP&C

2

Análisis de bloqueos existentes

3

Reforzar motivos de bloqueo con los scrums

2. Participantes considerados para Piloto de Modelo de dependencias e impedimentos

Especialidades / Áreas de Apoyo piloto

Engineering			Finanzas	Client Solutions	Jurídico
Infrastructure & IT Operations	Architecture Engineering	Security Architecture	Contabilidad Corporativa	UX	Legal Services
Fabián de Jesús Martínez Navarro	Manuel Trejo González	Carmina Cecilia Espinosa	Elizabeth Joselin Rios	Nora Tejeda	Mario Alberto Gloria
					Procurement
					TBD

Shapers

Systems Engineering	SP&C	Release Execution Managers (REMs)	RTEs	SDA Office
Rosa Isela Briones Luz Cuevas Mariana Rabadan	Olimpia Martinez Rafael Meza Jose Alfredo Jimenez Karina Lopez Herrera	Adan Romero Sanchez Carlos Alberto Ruiz Aguilar Emilio Jose Bravo Rodriguez Lilia Torres Lopez Manuel Francisco Fernández Mera	Diana Ramirez Gonzalez Erika Yvette Flores Padilla Fernando Reyes Trejo Luz Estrella Toledo Domínguez Marco Polo Hernández Castellanos Paola Navarro Penagos Pavel Perea Romero	Analucía Cuellar Andrés Neria
BPE	Service Owners			Agile Office
Laura Santisteban Ricardo Almonte Hugo Ramos	App Owners (Tech Leads)			Francia Leticia Fuentes

2. Inclusión de Jurídico Procurement

Directorio de Especialistas / Áreas de Apoyo en Piloto

Especialistas / Áreas de Apoyo		Impediment Labels
1	Architecture Engineering	#ARQ_Impediment
2	Cyber Security	#CYBER_Impediment
3	Infrastructure & IT Operations	#INFRA_Impediment
4	Design & UX	#UX_Impediment
5	Finanzas (Arquitectura Contable)	#FIN_Impediment
6	Jurídico (Legal Services)	#JUR_Impediment
7.	Jurídico (Procurement)	#JURPROC_Impediment

New

3. Coordinación de Clínicas Agile

De cara a la preparación de la Clínica Agile (14 de marzo) se proponen los siguientes puntos para bajar la información a los scrums participantes

Scrums Participantes

- 30 equipos Scrums (*Product Owners* y *Scrum Masters*)
- Atendidos por alguno de los 5 REMs considerados
- Con dependencia en Q1 a alguna área del piloto

Agenda propuesta

- 1. Journey del Modelo de Alta de Bloqueos e Impedimentos**
(10 min)
- 2. Diferencias entre bloqueos e impedimentos**
(10 min)
- 3. Modelo de Escalado de la SDA**
(10 min)
- 4. Q&A**
(15 min)

4. Next Steps... (01 de marzo)

1

Incluir **tickets de análisis** en Dashboard

2

Cierre de material para **Clínicas Agile**

3

Análisis a Impedimentos y Bloqueos **actuales**

Agenda - 08 de marzo

1 Inclusión de Tickets de Análisis en Datastudio

2 Hallazgos - Bloqueos e Impedimentos

3 Modificación al Journey

4 Alertamientos Engineering

5 Next Steps...




2. Hallazgos - Bloqueos e Impedimentos

Se han detectado los siguientes hallazgos respecto al Nuevo Modelo de Bloqueos e Impedimentos:

	Hallazgo	Propuesta
Bloqueos	Altas realizadas por Áreas de Apoyo	-Reforzar apoyo de RTEs / REMs para la solución de bloqueos -Generar reglas sobre el registro del detalle en los Comments de JIRA
Impedimentos	Los warnings o riesgos no se deben considerar	Reforzar información sobre la postal y Agile Forum
	Planes tácticos o replanificaciones en los entregables	Por discutir...

3. Modificación al Journey

Implementar el nuevo modelo homologado para la atención de dependencias e impedimentos de los scrums en JIRA

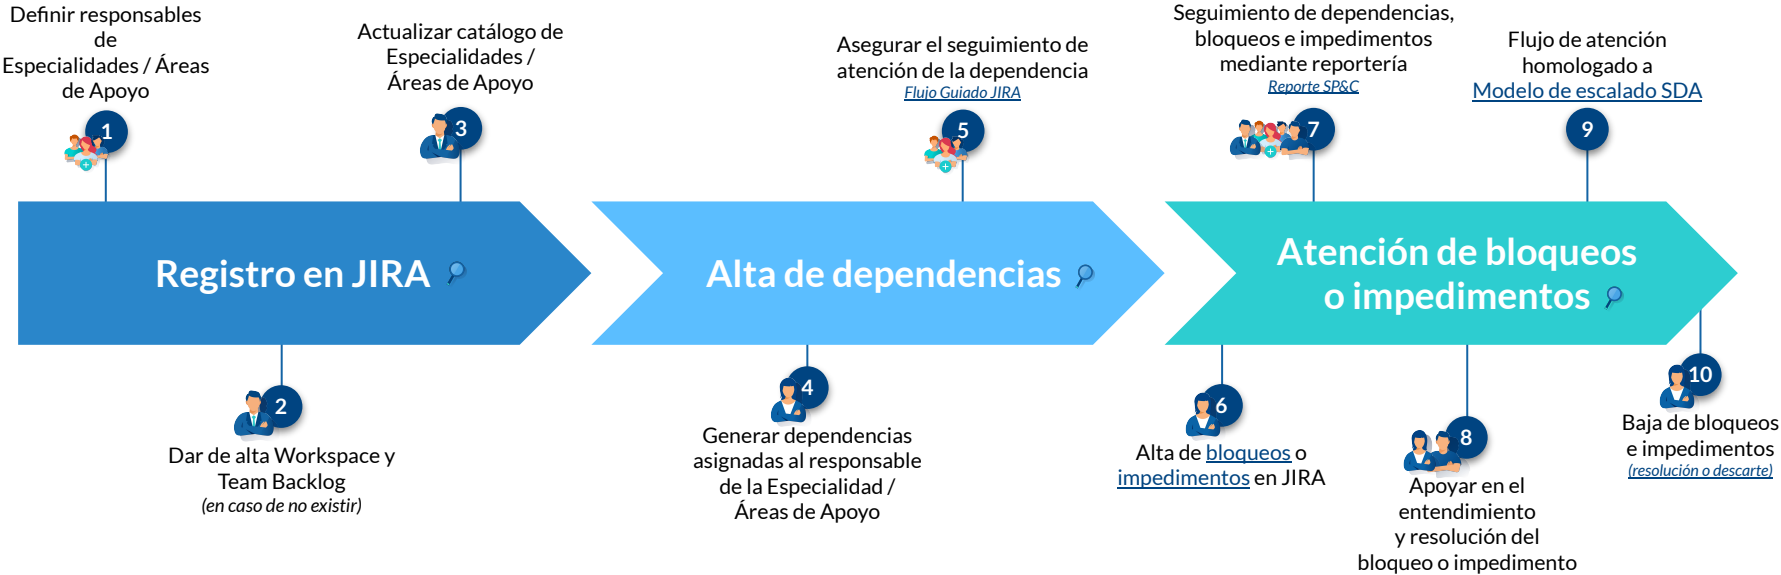

Agenda - 08 de marzo

1 Inclusión de Tickets de Análisis en Datastudio

2 Hallazgos - Bloqueos e Impedimentos

3 Modificación al Journey

4 Alertamientos Engineering

5 Next Steps...



5. Next Steps... (08 de marzo)

- 1 Informar a equipos Scrum sobre el nuevo modelo en el **Agile Forum**
- 2 Refinamiento del **alta de bloqueos** (comments)
- 3 Definición de “estatus” de **impedimentos** con entregables desplazados
- 4 Apoyo de SP&C para inclusión de **Tickets de Análisis** en Datastudio
- 5 Continuidad para inclusión de **Jurídico Procurement**

Análisis de bloqueos identificados



Impedimentos presentados en EECC (04 al 08 de marzo)

Debido a las quincenas se han presentado **degradaciones en los ambientes de prueba en entornos previos** lo que impide a los scrums continuar con sus validaciones y detener el continuous flow

	Nombre	Motivo de Impedimento	Impacto	Días stopper	Fecha Alta Impedimento JIRA
SDATOOL 40950	Evolución de crédito Pyme	Inestabilidad de Entornos Previos en pruebas de Circuito de contratación PyME	Intermitencia y degradación del ambiente en entornos previos evitando concluir periodos de pruebas para liberar el 20 de marzo	5 días	6 de marzo
SDATOOL 43893	Automatización, Contraste Firmas, Candados & ID	Inestabilidad de entornos Test en ambientación de clientes	Desfase en el plan de trabajo del equipo al no conseguir las ambientaciones para realizar las pruebas	3 días	8 de marzo
SDATOOL 44476	PRaaS Hipotecario	TBD	TBD	TBD	TBD

Principales hallazgos identificados dentro del piloto

Se han detectado los siguientes hallazgos respecto al Nuevo Modelo de Bloqueos e Impedimentos:

	Hallazgo	Propuesta
Bloqueos	Altas realizadas por Áreas de Apoyo	-Reforzar apoyo de RTEs / REMs para la solución de bloqueos -Generar reglas sobre el registro del detalle en los Comments de JIRA
Impedimentos	Los warnings o riesgos no se deben considerar	Reforzar información sobre la postal y Agile Forum
	Planes tácticos o replanificaciones en los entregables	Por definir con Systems, SP&C, y JIRA DevOps

Agenda - 15 de marzo

- 1 Propuestas para Hallazgos
- 2 Recomendaciones para la redacción de Impedimentos y Bloqueos
- 3 Roadmap Expansión
- 4 Next Steps...



1. Propuestas para hallazgos del Nuevo Modelo de Bloqueos e Impedimentos

Se tienen las siguientes propuestas para atender los hallazgos en el Nuevo Modelo de Bloqueos e Impedimentos:

	Hallazgo	Propuesta	Ventajas	Desventajas
Bloqueos	Altas realizadas por Áreas de Apoyo	Reforzar apoyo de RTEs / REMs para la solución de bloqueo	Con apoyo de RTEs / REM se filtrarían correctamente los bloqueos	Actividad manual para RTEs / REMs
		Incluir etiqueta que identifique quien realiza el bloqueo	Identifica correctamente quien bloquea la dependencia	Registro incorrecto de la etiqueta no se contabiliza en Datastudio
Impedimentos	Planes tácticos o replanificaciones en los entregables	Agregar comentario señalando el desplazamiento del entregable	Se tendría claridad en el tracking del impedimento	Actividad manual, no se tendría tracking en Datastudio
		Agregar etiquetas para indicar el Q en el que se atiende el impedimento	Identifica correctamente el Q en el que se está atendiendo	Registro incorrecto de la etiqueta no se contabiliza en Datastudio

¡Recuerda!

Puedes utilizar los siguientes tips para redactar correctamente tus bloqueos y/o impedimentos



Para Impedimentos...

En la sección de “Description” del impedimento cargado

Paso 1: *Detalla de forma resumida y clara los siguientes datos*

Fecha de inicio + Consecuencia + Impacto

Paso 2: *Enlista los diferentes momentos en los que se intentó resolver el impedimento*

04 mar: Al momento de ingresar usuario y contraseña en EECC, lanza error de usuario/contraseña/certificado incorrectos

Tip adicional: Recuerda incluir las áreas y/o personas con las que se ha interactuado para la solución del impedimento



Para bloqueos...

En la sección de “Comments” de la dependencia bloqueada

Incumplimiento de fecha de entrega:

Se bloquea dependencia porque [Scrum / AA] no ha cumplido con los niveles de atención acordados

Falta de entendimiento y/o definiciones:

Se bloquea dependencia porque [Scrum / AA] no ha compartido [sesión de entendimiento / definición de proyecto]

Falta de documentación o insumos:

Se bloquea dependencia porque falta que [Scrum / AA] proporcione [insumo 1], [insumo 2], [insumo 3], etc.

¡Recuerda!



Una dependencia es una solicitud o entregable proporcionado por un especialista de cualquier otro equipo o Área de Apoyo

- ✓ Son tareas independientes, negociables, planificables y cuantificables



¿Qué es un impedimento?


Cualquier asunto que impida llevar a cabo un compromiso (Feature, Historia de usuario o Dependencia)

- ✓ Indisponibilidad de herramientas
- ✓ Imposibilidad de conseguir casos de pruebas
- ✓ Asuntos con Áreas de Apoyo que no atienden por medio de dependencias
- ✓ Stoppers que se presenten con entidades externas como CNBV o INFONAVIT
- ✓ Incumplimiento en una fecha de entrega

No aplican...

- ✗ Riesgos o warnings (algo que pueda suceder)
- ✗ Solicitudes dentro del nivel de servicio acordado
- ✗ Dependencias levantadas de forma extemporánea
- ✗ Asuntos que se puedan resolver en el equipo de forma interna

3. Roadmap para expansión de Nuevo Modelo

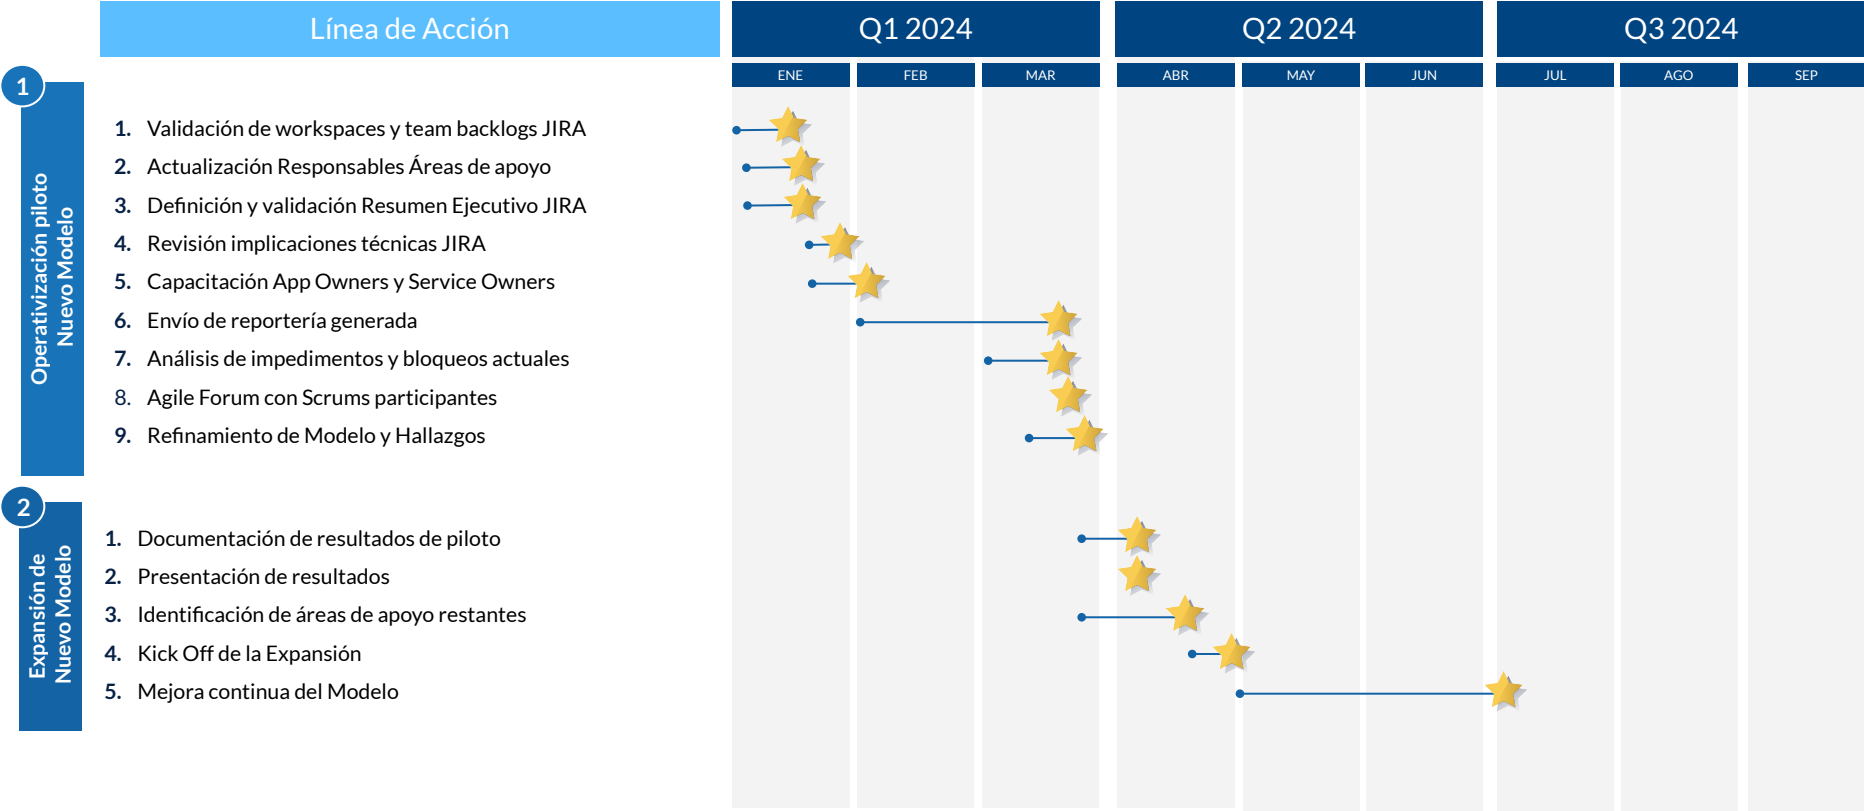

¹ Global Software Development
² Infrastructure & IT Operations, Architecture Engineering, Security Architecture, Contabilidad Corporativa, Legal Services, UX
³ La Expansión estará sujeta a los resultados del piloto

4. Next Steps...

1

Sesión **Agile Forum** con Scrums seleccionados (21 de marzo)

2

Documentación de **resultados** del piloto

3

Preparación de información para **expansión** al resto de Áreas de Apoyo


Agenda - 22 de marzo

- 1 Ajuste a Modelo de Impedimentos
- 2 Estatus de Cierre para Impedimentos
- 3 Observaciones Adicionales (Infra Holding)
- 4 Next Steps...




1. Nuevo Modelo de Atención E2E de Dependencias e Impedimento

Ajuste al Modelo de Atención derivado de los comentarios de Holding para el escalamiento sólo de impedimentos

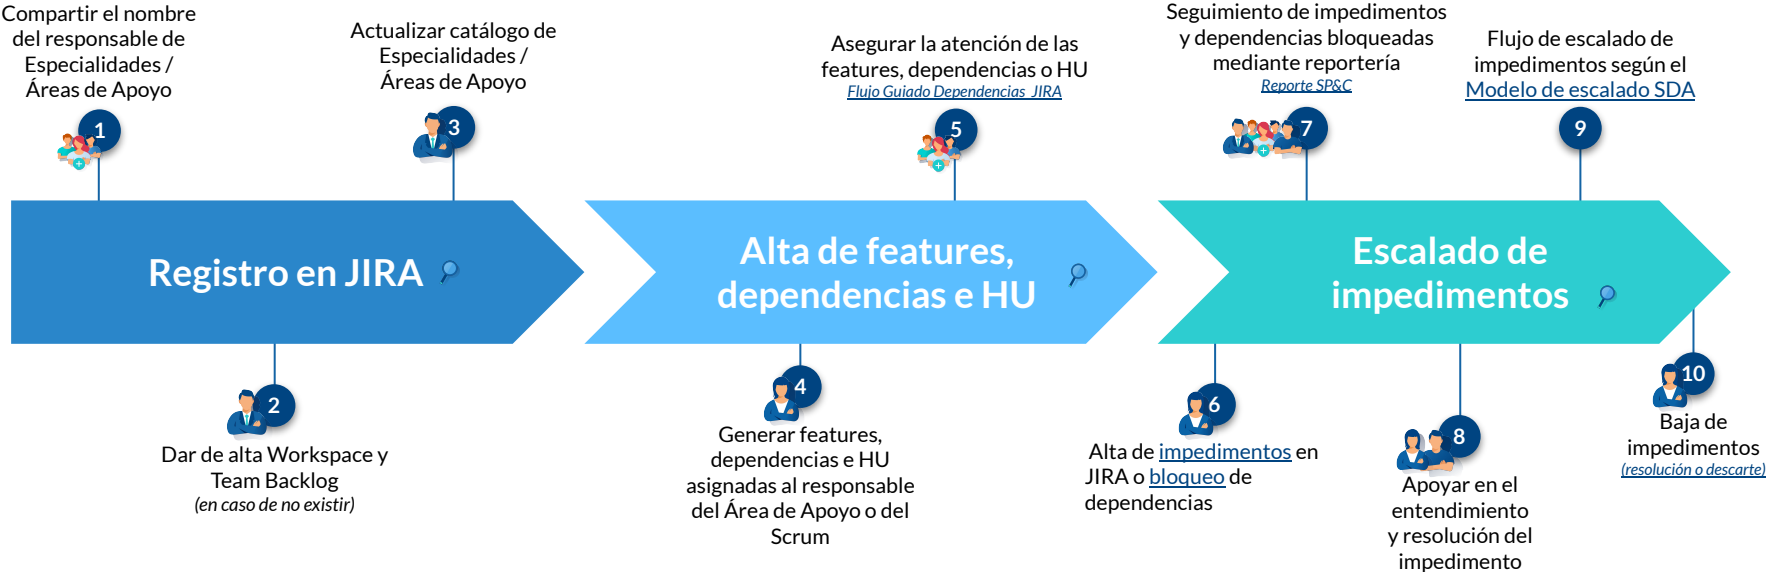

2. Estatus de Cierre para Impedimentos

- **Quién:** Scrum Master o App Owner (Tech Leads Specialists) / Usuario que dió de alta el impedimento
- **Cuándo:** cuando el impedimento haya sido resuelto o desestimado

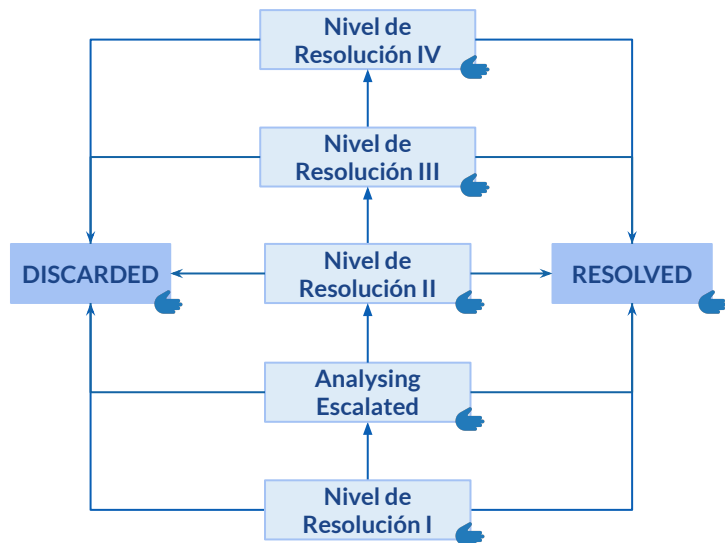

Definiciones actuales de los estatus:

Independientemente del Nivel de Escalado que se encuentre el Impedimento, éste se considerará **cerrado** cuando se haya tomado una decisión al respecto, pudiéndose dar alguno de estos dos **Estados finales**:

RESOLVED.- se ha tratado con los implicados y se ha llegado a un acuerdo para su resolución. Ejemplos:

- Alguna de las partes no llega a un despliegue, se acuerda pasar el despliegue a otra fecha, por lo que se replanifica el entregable y se marca el Impedimento como “Resolved”.

DISCARDED.- Tras estudiar el bloqueo se ve que no aplica el Impedimento. Ejemplos:

- El entregable se ha descartado tras ver la inviabilidad.
- Se necesitaba un desarrollo en una Tecnología que finalmente se ha decidido hacer en otra.

Se debería tener alguna alternativa para identificar los impedimentos que **modifiquen la fecha de despliegue** de la iniciativa.

Agenda - 22 de marzo

- 1 Ajuste a Modelo de Impedimentos
- 2 Estatus de Cierre para Impedimentos
- 3 Observaciones Adicionales (Infra Holding)
- 4 Next Steps...



4. Next Steps...

1

Cierre de **actualización** del modelo y ajuste a documentación

2

Nueva fecha para **Agile Forum**

3

Ajustes al **Datastudio** y a las **definiciones** de estatus de cierre

Áreas de Apoyo faltantes

Áreas de Apoyo			
1	Systems Engineering	20	Experiencia Única
2	Data Engineering	21	GRO
3	Architecture	22	
4	Information Security	23	Legal Services
5	BPE	24	Marketing & Digital Sales
6	Operations	25	Design & UX
7	Corporate Security	26	Minorista / Individual Risk
8	Infrastructure & IT Operations	27	MIS (Plataforma Informacional)
9	Financial Crime Prevention	28	Nuevos Negocios Digitales e Inclusión Financiera
10	A&GD & M&AS	29	Producción y Control Interno Financiero
11	Antifraud Governance	30	Riesgos Particulares
12	Architecture & Global Deploy	31	Riesgos
13	Banca de Empresas y Gobierno	32	Riesgos RSG
14	Capacity & Performance Management	33	Security & Protection Mex
15	Arquitectura Contable	34	Global (Systems)
16	Crédito y Medios de Pago	35	Infraestructura Holding
17	Customer Care Center		
18	Customer Relationship Management		
19	Engineering Risk & Corporate Assurance		

Piloto: Nuevo Modelo Atención E2E Dependencias e Impedimentos Especialidades/AACC en JIRA

Mostrar el Nuevo Modelo de Impedimentos de cara a la expansión y comprender la participación de Operations considerando el flujo de acuerdo a la interacción con los equipos de desarrollo

¿En qué consiste?

Visibilizar y dar trazabilidad a los impedimentos que se generen en los equipos de desarrollo (Scrum y Áreas de Apoyo)

Considera **herramientas y procesos** definidos por la SDA (JIRA y Modelo de Escalado)

Reportería compartida a los **responsables** de las Áreas de Apoyo y proyectos para seguimiento

Áreas de Apoyo participantes

- 1. **Infraestructure & IT Operations** - Fabian Martinez
- 2. **Architecture Eng** - Manuel Trejo
- 3. **Security Architecture** - Carmina Cecilia Espinosa
- 4. **Contabilidad Corp.** - Elizabeth Rios
- 5. **UX** - Nora Tejeda
- 6. **Jurídico** - Mario Alberto Gloria

Proceso

- 1. **Dar de alta el impedimento en JIRA**
(*videotutorial JIRA*)
- 2. **Apoyo con REM para entendimiento y resolución**
- 3. **Realizar seguimiento del impedimento mediante la reportería**
(*Datastudio SP&C*)
- 4. **Escalado del impedimento de acuerdo al número de días hábiles**
(*Modelo de escalado SDA*)
- 5. **Resolución o descarte del impedimento**

Impacto

- Apoyar en el continuous flow de los equipos
- Reducir los tiempos de atención de las dependencias
- Visibilizar stoppers en el Proceso de Creación de los equipos
- Registro bidireccional de stoppers

Próximos Pasos

- 1. Identificar Áreas de Apoyo y Responsables con todas las DGs
- 2. Formalización del proceso con SDA y roles Agile
- 3. Asistir a Agile Forums con Scrums para formalizar proceso
- 4. Expansión del Nuevo Modelo de Impedimentos

Resultados Piloto: Nuevo Modelo Atención E2E Dependencias e Impedimentos Especialidades/AACC en JIRA

26 Febrero- 22 Abril



Intervinientes principales


Áreas de Apoyo (AA)

- 1. **Infrastructure & IT Operations** - Fabian Martinez
- 2. **Architecture Eng** - Manuel Trejo
- 3. **Security Architecture** - Carmina Cecilia Espinosa
- 4. **Contabilidad Corp.** - Elizabeth Rios
- 5. **UX** - Nora Tejeda
- 6. **Jurídico** - Mario Alberto Gloria

Shapers (25 personas)

- Systems Eng** - Rosa Briones, Luz Cuevas
- SP&C** - Olimpia Martinez, Rafa Meza, Alfredo Jimenez
- SDA Office** - Analucia Cuellar, Andrés Neria
- Agile Office** - Francia Fuentes, Roman Cuevas
- BPE** - Laura Santisteban, Hugo Ramos

Avances en Reportería

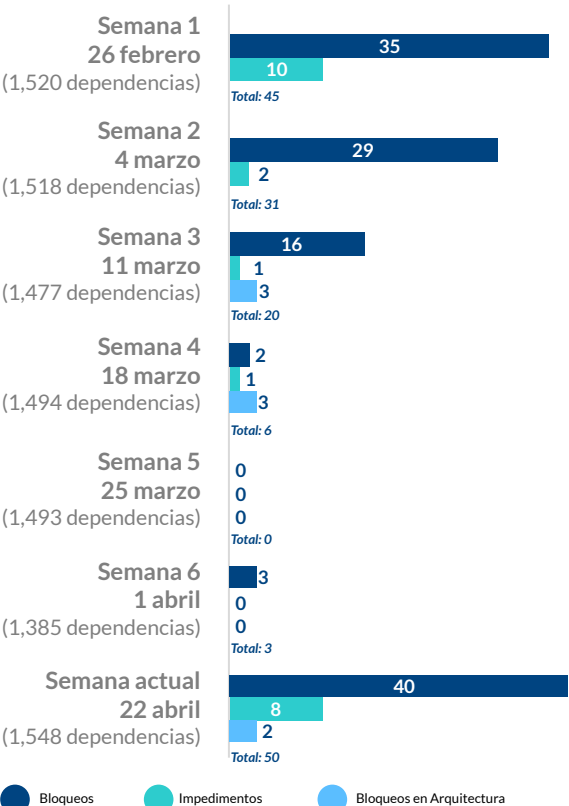

Hitos principales

- 24 de enero - Cierre de Modelo
- 09 de febrero - KickOff del piloto
- 26 de febrero - 1er envío de reporte semanal
- 08 de marzo - Documentación de hallazgos
- 11 de marzo - Integración de Tickets Arq.*
- 20 de marzo - Reunión GSD Holding
- 25 de marzo - Refinamiento del Modelo
- TBD - Agile Forum con Scrums

Hallazgos

- 1. Complejidad en modelo al manejar 2 conceptos (bloqueos e impedimentos)
- 2. Warnings o riesgos que quieren ser considerados como impedimentos
- 3. Impedimentos desplazados (riesgo a que no se cierre)
- 4. Definición estatus resolved en impedimentos
- 5. Áreas de apoyo que no atienden por JIRA (Jurídico Procurement)

Solución

- 1. Simplificación flujo sólo con concepto de impedimentos**
- 2. Distribución postal con consideraciones de Impedimentos
- 3. Etiqueta para indicar Q en el que se trabaja el impedimento
- 4. Redefinición de estatus en manuales JIRA
- 5. Integración al flujo de impedimentos por JIRA

* Atención por tickets en lugar de dependencias

**Propuesta GSD Holding

Solución Táctica
